

伊佐市公共建築物個別施設計画

令和3年3月

伊佐市

目次

第1章 計画の概要	1
第1節 背景・目的	1
第2節 総合管理計画における基本的な方針	2
第3節 個別施設計画の必須項目	5
第4節 本計画の位置づけ	6
第5節 対象施設	7
第6節 計画期間	9
第2章 計画作成フロー	10
第1節 計画作成フロー	10
第3章 優先度の判定	11
第1節 基礎情報把握	11
第2節 一次評価（健全度）	20
第3節 二次評価（保全優先度判定）	22
第4章 対策内容の設定	23
第1節 対策内容一覧	23
第2節 対策内容検討	24
第3節 対策内容の設定	24
第5章 対策の実施時期設定・費用試算	28
第1節 対策費用シミュレーション方法	28
第2節 耐用年数・建設単価の設定	28
第3節 実施時期設定と費用試算	30
第6章 計画のフォローアップ	44
第1節 計画のフォローアップ	44

第1章 計画の概要

第1節 背景・目的


本市では、平成28年度に、保有する公共施設等の現状と課題を分析し、適切な保有と維持管理等に関する基本的な考え方を示すために「伊佐市公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」という）を策定しました。

財政的な負担となる更新費用を推計し、持続可能な自治体経営ができるよう、公共施設等の総合的な管理に関する基本的な方針を定め、公共施設に関わる維持・更新費用を、今後40年間で50%削減することを目標としました。

総合管理計画では、市全体の公共施設の総合的な状況把握、方針の策定を行いました。さらに個別の施設ごとの実行計画を策定することが求められており、具体的な対策内容や実施時期、対策費用を考える必要があります。

そのため、本市の関連計画と整合を図りながら、施設の劣化状況等を踏まえ、本市が所有する公共施設等のうち公共建築物を対象とした、伊佐市公共建築物個別施設計画（以下、「本計画」という）を策定します。

なお、参考として本計画に関する総務省資料は、以下のとおりです。

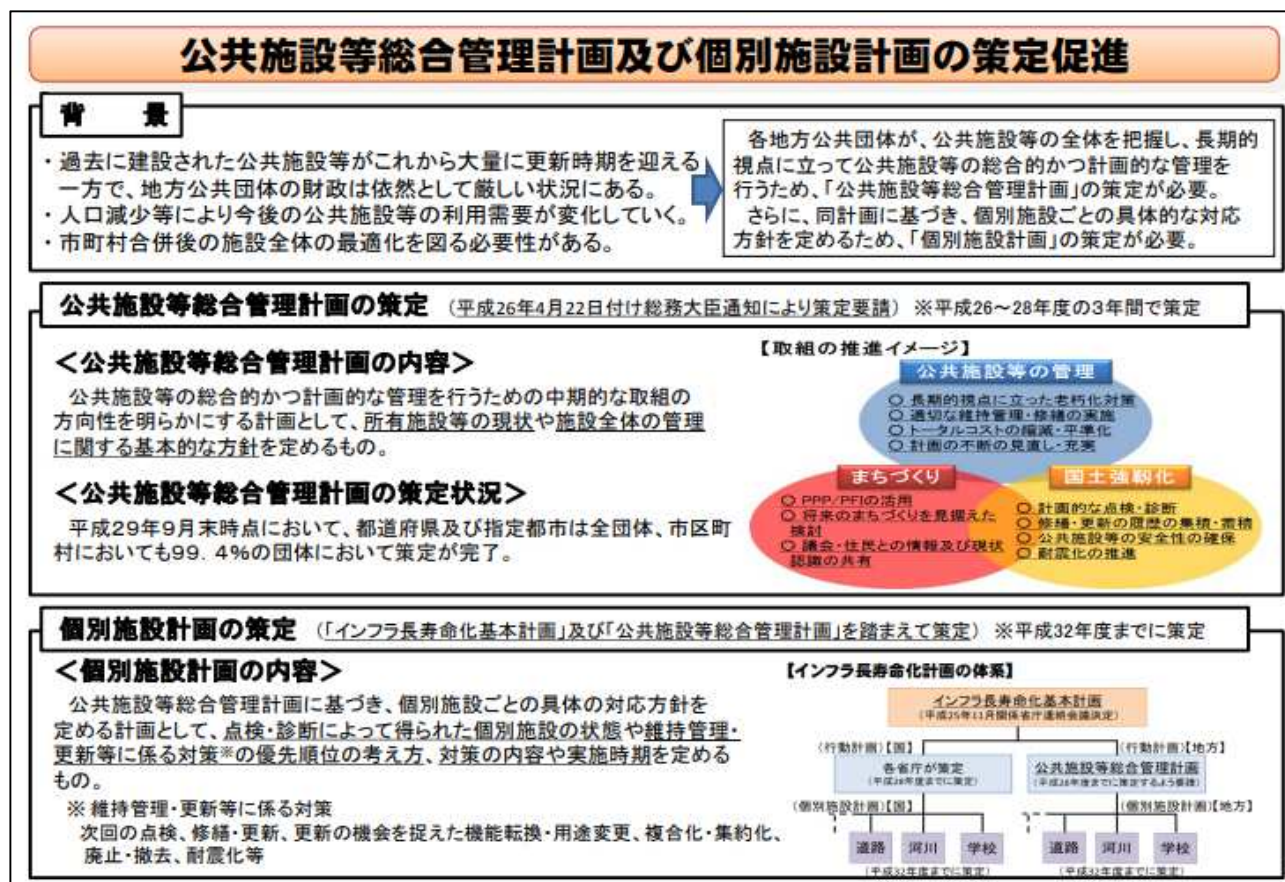

公共施設等総合管理計画の更なる推進に向けて 平成30年4月23日（月）総務省自治財政局財務調査課

第2節 総合管理計画における基本的な方針

総合管理計画において以下の基本方針を設定しています。

「総合管理計画」より抜粋 （公共施設等の管理に関する基本的な方針）

基本方針

- ① 公共施設等の適正配置と総量縮減
 - ・施設の複合化や用途変更、統廃合を推進し、「保有施設の適正配置」に取り組みます。
 - ・現在保有する公共施設の「施設総量の縮減」に取り組みます。
- ② 公共施設等の長寿命化と安全性の確保
 - ・予防的修繕によりライフサイクルコストを縮減し、「公共施設等の長寿命化」を図ります。
- ③ 公共施設等の効率的な管理運営
 - ・集約化や複合化・共有化により、可能な限り「公共施設等の有効活用」を図るとともに、民間活力の導入など効率的な管理運営に努めます。
 - ・全庁的な実施体制を整備し、一元的に「公共施設マネジメント」を推進します。

公共施設に関わる維持・更新費用を、今後40年間で50%削減することを目標とします。

実施方針

① 適正配置と総量縮減の推進方針

・公共施設等の新設

「建物の新設」は、集約・複合化により施設の利用度や効率性を高め、まちづくりとして相乗的な効果が期待できる場合に限り、原則として施設総量の純増につながる大規模な施設の新設は行いません。

・既存施設の見直し・更新

既存施設の統廃合や複合化等の可能性について継続的に検討します。

更新の場合は、適正な規模・設備、将来的な活用方法を十分検討したうえで、安全で管理しやすく、再利用が可能な設計に心がけます。

・圏域別の機能分担

各施設について、圏域別（市全体、地区(旧市町)、地域(旧町村)、生活圏(校区)）に必要な機能を分担し、維持または集約を検討していきます。

・集約による機能増強

施設を「集約」する場合は、距離的な利便性が失われる可能性があることから、設備等の充実による機能性の向上や複合的なサービスの提供を図るなどの工夫を行い、利用者の満足度の向上に努めます。

・廃止後の跡地利用

施設の用途廃止後の取扱いは、原則的には遊休資産とし、他に代替がない場合は必要な機能のみを残すこととします。

統廃合を伴う場合、集約先となる公共建築物は、減築等により適正規模での改築、更新を行うこととします。

② 長寿命化と安全確保のための実施方針

・点検診断等

公共施設等の日常点検、法令等に基づく定期点検、災害や事故発生時等に行う緊急点検劣化診断等を実施し、その結果を蓄積し、各施設の老朽化対策に活用します。

・維持管理・修繕・更新

従来の「事後保全型管理」から「予防保全型管理」と「状態監視保全型管理」を基本とする手法に転換し、計画的な維持管理による各施設の長寿命化とライフサイクルコストを縮減します。

・安全確保

日常点検や定期点検により施設の劣化状況を把握し、予防保全による適切な処置を計画的に実施することで、利用者の安全性を確保します。

・耐震化

耐震化は総合的な検討の上で、優先順位をもって計画的に耐震診断・耐震改修を行います。耐震化対策が未実施の施設は、可能な限り安全性を高めるための避難対策を講じます。

③ 効率的な管理運営の実施方針

・施設の有効活用

既存施設の効率的な運用について見直し・再検証し、空きスペースなどの有効活用を図ります。更新時に集約化が困難である場合、複合化・共有化により、効率的な施設の運用に取り組みます。また、複合施設とする場合は、各種サービスが複合化されることで利便性の向上につながるよう工夫します。

・民間活力の導入

保有資産が抱える課題に対応するため、可能な範囲において官民連携の考え方による民間活力の導入を図ります。

・管理体制の構築

総合的かつ計画的な公共施設の管理のための庁内組織を形成し、全庁的な取り組みとして「公共施設マネジメント」を推進します。

公共施設等に関する情報をデータとして一元的に管理し、適正な維持管理や計画的な改修・更新などに役立てていきます。

第3節 個別施設計画の必須項目

以下に示す記載事項を基本として、個別施設計画を作成することが求められております。

個別施設計画の記載事項について

(※平成25年11月インフラ長寿命化基本計画から抜粋)

2. 個別施設毎の長寿命化計画

各インフラの管理者は、各施設の特性や維持管理・更新等にかかる取組状況等を踏まえつつ、以下に示す記載事項を基本として、メンテナンスサイクルの核となる個別施設計画をできるだけ早期に策定し、これに基づき戦略的な維持管理・更新等を推進する。

なお、各インフラの管理者が既に同種・類似の計画を策定している場合には、当分の間、当該計画をもって、個別施設計画の策定に代えることができるものとする。・・・

〔記載事項〕

①対象施設

行動計画において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。計画の策定に当たっては、各施設の維持管理・更新等にかかる取組状況や利用状況等に鑑み、個別施設のメンテナンスサイクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例えば、事業毎の分類（道路、下水道等）や、構造物毎の分類（橋梁、トンネル、管路等）等）を設定の上、その単位毎に計画を策定する。

②計画期間

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を考慮の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとする。

本基本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図る。

③対策の優先順位の考え方

個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利用状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定の上、それらに基づく優先順位の考え方を明確化する。

④個別施設の状態等

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検・診断を未実施の施設については、点検実施時期を明記する。

また、「IV. 2. ③対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の状態以外の事項について、必要な情報を整理する。

⑤対策内容と実施時期

「IV. 2. ③対策の優先順位の考え方」及び「IV. 2. ④個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検・診断や修繕・更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎に整理する。

⑥対策費用

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する。

14

公共施設等総合管理計画の更なる推進に向けて 平成30年4月23日（月）総務省自治財政局財務調査課


なお、それぞれの項目に対しての本計画での内容は以下のとおりです。

記載事項	本計画内での内容
①対象施設	総合管理計画で対象とした公共建築物を対象とする。
②計画期間	令和3年度から令和12年度までの10年間
③対策の優先順位の考え方	施設の重要度と健全度から保全優先度判定を行う。
④個別施設の状態等	対象施設ごとの劣化度調査を行う。
⑤対策内容と実施時期	保全優先度や市の政策を考慮し、対策の内容や実施時期を施設ごとに整理する。
⑥対策費用	設計、計画等で算定した事業費、または建物構造から設定した統一単価による推計を行う。

第4節 本計画の位置づけ

本計画は、総合管理計画を上位計画として、計画期間内での対策内容と実施時期・対策費用等を記載した計画です。

類似する計画として、公共建築物では公営住宅長寿命化方針について定めた「伊佐市公営住宅等長寿命化計画」、インフラ施設では橋梁の長寿命化について定めた「伊佐市橋梁長寿命化修繕計画」などが挙げられます。

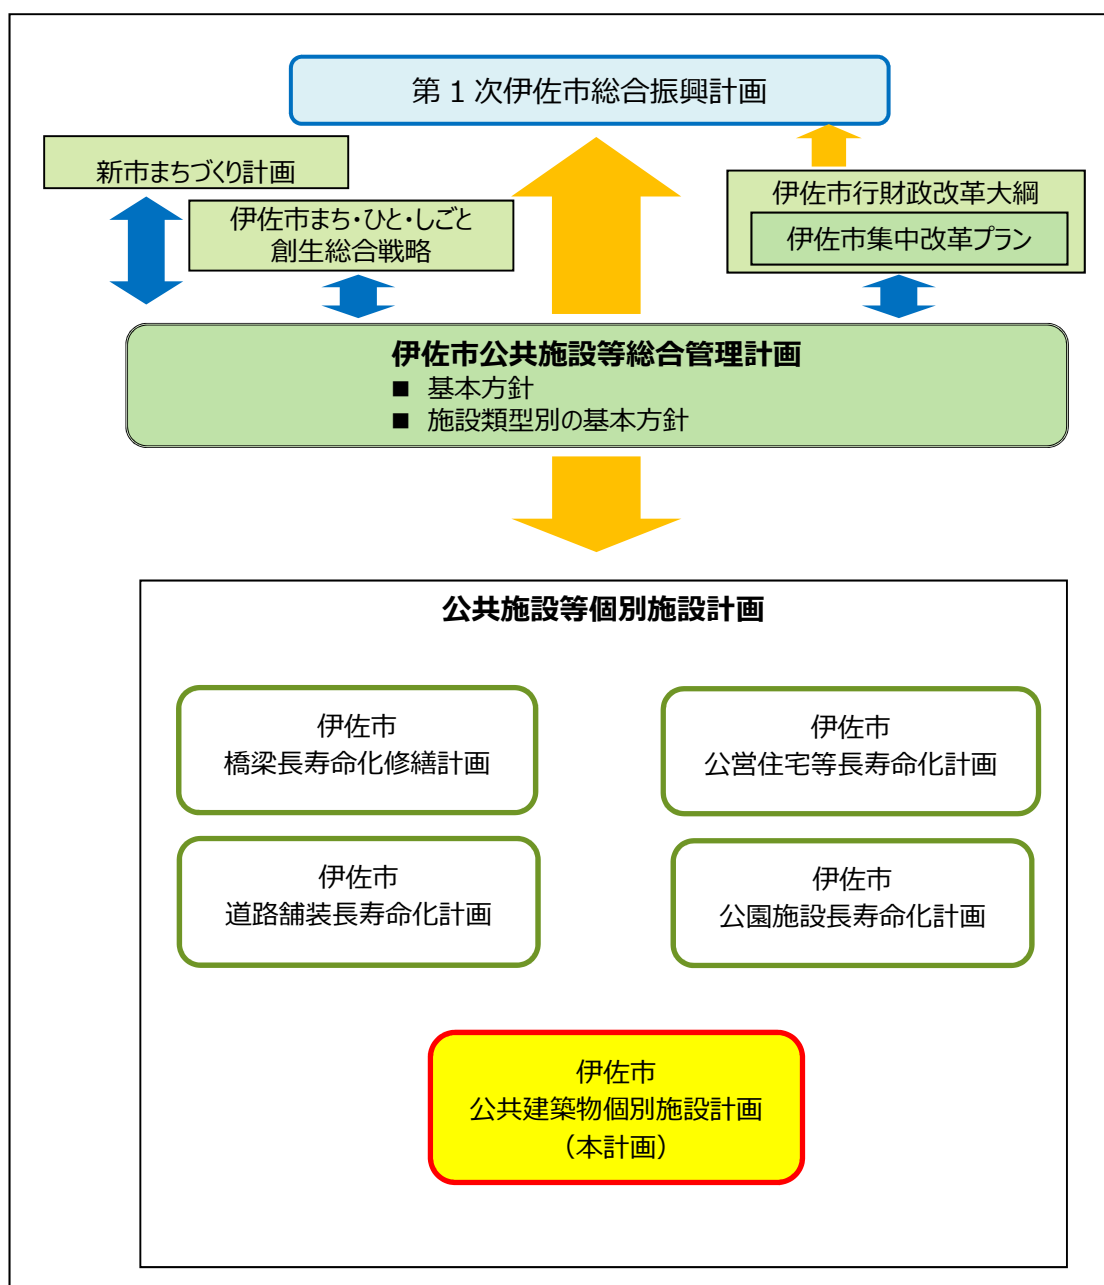


第5節 対象施設

本計画の対象施設は、本市の所有する公共施設等のうち、「公共建築物」を対象とします。施設の分類は、総合管理計画と同様の分類です。

その中で「公営住宅」、「公園」に分類されている施設については、別途「伊佐市公営住宅等長寿命化計画」、「公園施設長寿命化計画」を定めています。

対象施設数：167 施設

対象建物棟数：353 棟

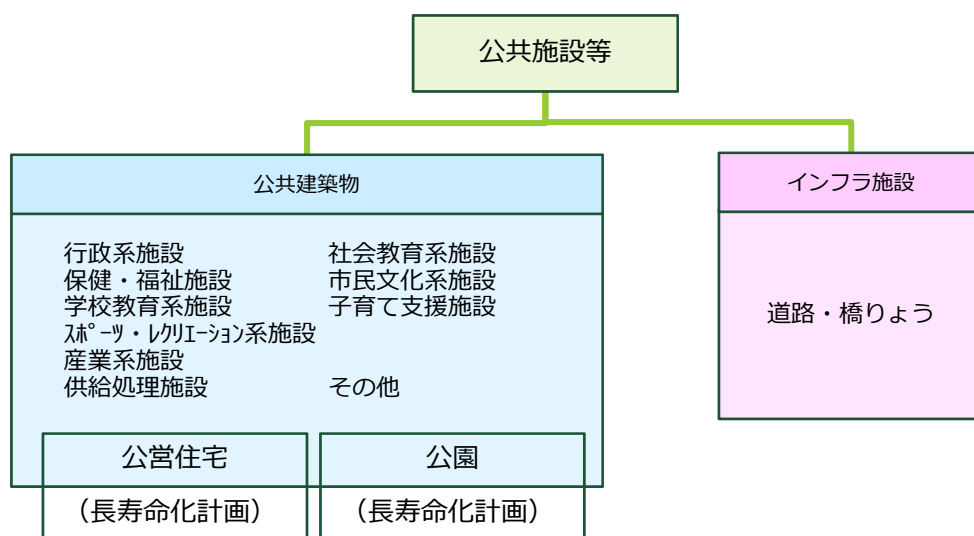

※公営住宅、公園については別途個別施設計画書を策定済みであり、本計画で重複している施設はそれぞれの既存計画書から情報を反映して作成しています。

公共建築物の詳細分類

	大分類	中分類	対象施設
1	行政系施設	庁舎等	伊佐市役所大口庁舎、伊佐市役所菱刈庁舎
		その他	上町班消防詰所、第10分団消防詰所 など
2	社会教育系施設	図書館	菱刈ふるさといきがいセンター
		その他	ふれあいセンター、伊佐市大口元気こころ館 など
3	保健・福祉系施設	高齢福祉施設	
		保健施設	伊佐市菱刈総合保健福祉センター など
4	市民文化系施設	集会施設	ひまわり館、菱刈人権文化センター など
		文化施設	文化会館、菱刈環境改善センター
5	学校教育系施設	学校	大口小学校、大口中央中学校 など
		その他	伊佐市立学校給食センター
6	子育て支援施設	幼児・児童施設	本城幼稚園、子ども交流支援センター など
7	公営住宅	※公営住宅	元町団地、郡山団地 など
8	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	総合運動公園、農村公園 など
		レクリエーション・観光施設	十曾青少年旅行村、楠本川溪流自然公園 など
		保養施設	大口温泉高熊荘
9	公園	※公園	轟公園、曾木の滝公園 など
10	産業系施設	産業系施設	伊佐市ひしかり交流館、大口生活改善センター など
11	下水道施設	下水道施設	平出水集落排水施設、農業集落排水施設
12	供給処理施設	供給処理施設	大口リサイクルプラザ、伊佐市衛生センター(きり館) など
13	その他	その他	校長住宅、教頭住宅 など
14	普通財産	普通財産	淡水養魚場、貸付建物 など

※公営住宅、公園については別途個別施設計画を策定しています。


(注) 本分類は、総務省「公共施設及びインフラの更新費用推計ソフト」仕様書の施設分類を参考に作成しています。

第 6 節 計画期間

本計画期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とし、計画内容は社会情勢の変化や事業の進捗状況等に応じて、計画期間中においても適宜見直しを行うものとします。

なお令和 3 年度には、本計画に基づく対策効果を反映した経費見込み及び対策による効果額を総合管理計画に反映させます。

各計画の計画期間

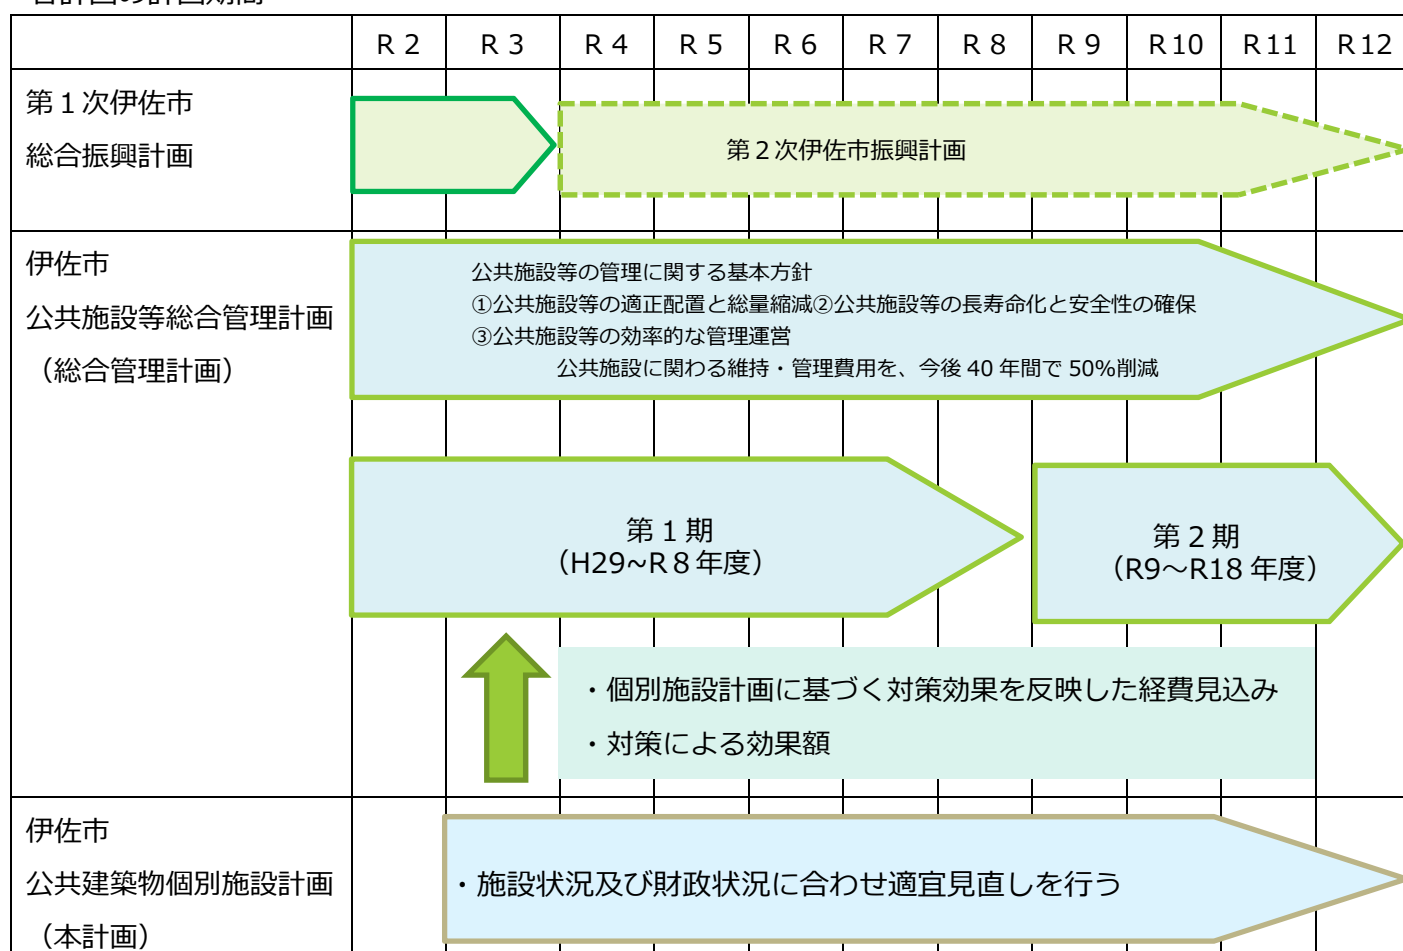


第2章 計画作成フロー

第1節 計画作成フロー

以下のフローで、計画期間内における対策の内容と費用を整理するものとします。

本計画では、施設の構造や健全度・保全優先度判定をもとに、施設ごとの計画期間内の対策内容を設定します。

本計画を活用し、日常的な維持管理を実施しながら、「予防保全型管理」として必要な時期に改修を行い、計画的に施設の延命化を図ります。

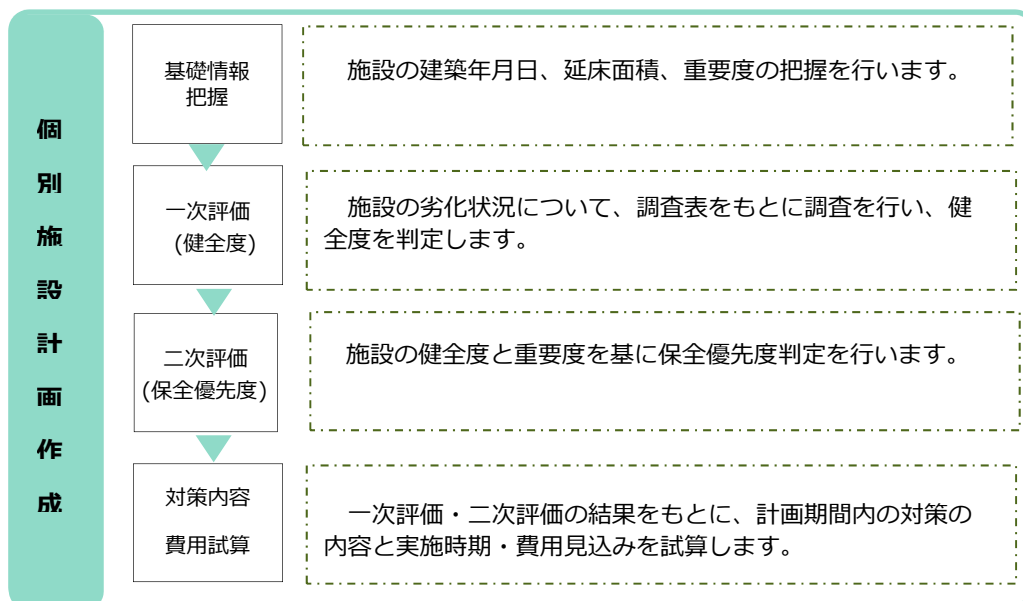

第3章 優先度の判定

第1節 基礎情報把握

対象施設ごとに建物情報、重要度の基礎情報を把握します。

調査内容は以下のとおりです。

基礎情報調査項目

調査項目	調査内容
建物情報	建物ごとの建築年月日、延床面積、構造など
重要度	評価項目をもとに、重要度判定を行う

重要度は、市の重要政策との関係性や施設規模をもとに、施設の重要度を数値化します。

なおⅠが高く、Ⅲが低い評価となります。

重要度判定評価項目

評価項目	重要度		
	Ⅰ 高い	Ⅱ	Ⅲ 低い
重要度	・重要な政策を実行する上で必要な施設 ・設置が義務付けられている施設 ・大規模施設	・小規模施設(平屋など)ではない ・設置義務がない ・縮小(もしくは廃止)による市民生活への影響がある	・縮小(もしくは廃止)しても影響の低い施設 ・小規模な施設(平屋など)

「基礎調査結果一覧」 - 1

個別 計画 NO	管理 計画 NO	建物情報									重要 度
		施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年 度	耐用 年数	経過 年数	
1	1	伊佐市役所大口庁舎	庁舎_本館	財政課	1 行政系施設	2,019.30	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1956	50	64	I
1	1	伊佐市役所大口庁舎	庁舎_別館	財政課	1 行政系施設	1,896.30	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1977	50	43	I
1	1	伊佐市役所大口庁舎	車庫・駐車場	財政課	1 行政系施設	160.00	鉄骨造	1977	38	43	I
2	6	伊佐市役所愛刈庁舎	庁舎	地域総務課	1 行政系施設	2,954.80	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1982	50	38	I
2	6	伊佐市役所愛刈庁舎	公用車庫(庁舎 北側 2)	地域総務課	1 行政系施設	119.07	鉄骨造	1982	38	38	I
2	6	伊佐市役所愛刈庁舎	庁舎倉庫(庁舎東 側 2)	地域総務課	1 行政系施設	103.50	木造	1989	24	31	I
3	48	防災用具倉庫(旧スクール バス車庫)	車庫・駐車場	総務課	1 行政系施設	72.00	軽量鉄骨造	1973	26	47	II
4	152	上町班消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	144.74	鉄骨造	1991	38	29	II
5	153	里町班消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	125.42	鉄骨造	1986	38	34	II
6	154	第9分団消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2012	38	8	I
7	155	第10分団消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2012	38	8	I
8	156	第3分団消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2013	38	7	I
9	157	第8分団消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2013	38	7	I
10	158	宮人書庫	倉庫	総務課	1 行政系施設	297.00	鉄骨造	1969	38	51	III
11	163	第4分団消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2015	38	5	I
12	164	第7分団消防詰所	詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2015	38	5	I
13	166	第2分団消防詰所	2分団消防詰所	総務課	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2017	38	3	I
14	20	愛刈ふるさといきがいセン ター	図書館	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	847.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	II
14	20	愛刈ふるさといきがいセン ター	生涯学習	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	236.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	II
14	20	愛刈ふるさといきがいセン ター	資料館	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	366.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	II
15	22	ふれあいセンター	集会所	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	3,485.00	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 造造	1991	50	29	I
15	22	ふれあいセンター	資料館	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	992.00	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 造造	1991	50	29	I
15	22	ふれあいセンター	図書館	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	1,080.00	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 造造	1991	50	29	I
15	22	ふれあいセンター	事務所	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	208.00	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 造造	1991	50	29	I
15	22	ふれあいセンター	店舗	教育委員会 社会教育課	2 社会教育系施設	147.00	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 造造	1991	50	29	I
16	15	伊佐市大口元気こころ館	多目的福祉施設	長寿介護課	3 保健・福祉施設	1,269.54	鉄骨造	2002	38	18	II
17	17	伊佐市愛刈総合保健福祉セ ンター	浴場	長寿介護課	3 保健・福祉施設	422.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2002	50	18	II
17	17	伊佐市愛刈総合保健福祉セ ンター	多目的保健施設	長寿介護課	3 保健・福祉施設	776.70	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1999	50	21	II
17	17	伊佐市愛刈総合保健福祉セ ンター	多目的福祉施設	長寿介護課	3 保健・福祉施設	1,799.66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1999	50	21	II
18	159	保健関係保管庫	多目的保健施設	こども課	3 保健・福祉施設	687.80	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1975	50	45	II
19	21	ひまわり館	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	159.26	木造	2003	24	17	II
20	23	羽月西青少年センター	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	141.88	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1977	50	43	II
21	24	羽月地区公民館	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	353.05	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾗｯｸ造	1973	41	47	II
22	26	牛尾青少年センター	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	119.24	木造	1977	24	43	II
23	27	共進地区教育集会施設	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	132.49	木造	1976	24	44	II
24	28	元町青少年会館	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	125.87	木造	1982	24	38	II
25	29	山野西文化交流館	校舎・図書	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	432.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1979	50	41	II
25	29	山野西文化交流館	体育館	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	210.00	鉄骨造	1981	38	39	II
26	30	小木原東集会所	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	132.39	木造	1985	24	35	II
27	31	松木原集会所	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	132.21	木造	1993	24	27	II
28	32	神池集会所	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	132.30	木造	1987	24	33	II
29	33	針持青少年センター	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	119.24	木造	1978	24	42	II
30	34	西永尾集会所	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	132.39	木造	1981	24	39	II
31	35	青木元教育集会施設	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	151.76	木造	1984	24	36	II
32	36	曾木青少年自立自興会館	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	125.87	木造	1985	24	35	II

「基礎調査結果一覧」 - 2

個別 計画 NO	管理 計画 NO	建物情報									重要 度
		施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	
33	37	大口東青少年センター	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	119.24	木造	1979	24	41	II
34	38	田中校区集会施設	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	821.64	鉄筋コンクリート造	1998	50	22	II
35	39	湯之尾校区集会施設	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	840.00	鉄筋コンクリート造	1986	50	34	II
36	40	平出水青少年センター	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	119.24	木造	1979	24	41	II
37	41	本城校区公民館	集会所	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	398.00	木造	1992	24	28	II
38	43	文化会館	文化会館	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	4,158.13	鉄骨鉄筋コンクリート 造	1981	50	39	I
39	44-2	薮刈環境改善センター	市民センター	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	1,354.97	鉄筋コンクリート造	1988	50	32	I
39	44-2	薮刈環境改善センター	野外ステージ	教育委員会 社会教育課	4 市民文化系施設	286.85	鉄筋コンクリート造	1991	50	29	I
40	143	布計地区多目的集会施設	集会所	農政課	4 市民文化系施設	195.00	木造	1996	24	24	II
41	147	西太良コミュニティセンタ ー	集会所	企画政策課	4 市民文化系施設	289.57	鉄筋コンクリート造	1973	50	47	II
42	148	山野基幹集落センタ ー	山野基幹集落セン ター	企画政策課	4 市民文化系施設	364.90	鉄筋コンクリート造	1975	50	45	II
43	149	大口富士福祉館	福祉館	市民課	4 市民文化系施設	132.30	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	II
44	150	薮刈人権文化センター	市民センター	市民課	4 市民文化系施設	198.00	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	II
45	49	大口小学校	校舎 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,058.00	鉄筋コンクリート造	1972	50	48	I
45	49	大口小学校	校舎 2	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	539.00	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	I
45	49	大口小学校	校舎 3	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,331.00	鉄筋コンクリート造	1974	50	46	I
45	49	大口小学校	校舎 4	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	583.00	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	I
45	49	大口小学校	校舎 5	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	602.00	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	I
45	49	大口小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,075.00	鉄筋コンクリート造	2000	50	20	I
46	50	大口東小学校	校舎・園舎_管理 教室棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,161.00	鉄筋コンクリート造	1962	50	58	I
46	50	大口東小学校	校舎・園舎_特別 教室棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	494.00	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	I
46	50	大口東小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1983	38	37	I
47	51	牛尾小学校	校舎・園舎 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,175.00	鉄筋コンクリート造	1963	50	57	I
47	51	牛尾小学校	校舎・園舎 2	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	399.00	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	I
47	51	牛尾小学校	音楽室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	210.00	木造	2001	24	19	I
47	51	牛尾小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1981	38	39	I
48	52	山野小学校	校舎 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,234.00	鉄筋コンクリート造	1967	50	53	I
48	52	山野小学校	校舎 2	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	396.00	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	I
48	52	山野小学校	校舎 3	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	338.00	鉄筋コンクリート造	1984	50	36	I
48	52	山野小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	798.00	鉄筋コンクリート造	1992	50	28	I
49	53	平出水小学校	校舎・園舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,080.00	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	I
49	53	平出水小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	710.00	鉄筋コンクリート造	1988	50	32	I
50	54	羽月小学校	校舎 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	2,209.00	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	I
50	54	羽月小学校	校舎 3	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	168.00	木造	1986	24	34	I
50	54	羽月小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	919.00	鉄筋コンクリート造	1991	50	29	I
51	56	羽月西小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	521.00	鉄骨造	1978	38	42	I
51	56	羽月西小学校	校舎・園舎 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,472.00	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	I
51	56	羽月西小学校	校舎・園舎 2	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	170.00	鉄骨造	2001	38	19	I
52	57	曾木小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	710.00	鉄筋コンクリート造	1986	50	34	I
52	57	曾木小学校	校舎・園舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,804.00	鉄筋コンクリート造	1990	50	30	I
53	58	針持小学校	校舎(旧幼稚園)	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	834.00	鉄筋コンクリート造	1975	50	45	I
53	58	針持小学校	校舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	791.00	鉄筋コンクリート造	1975	50	45	I
53	58	針持小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1982	38	38	I
54	59	湯之尾小学校	校舎・園舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,419.00	鉄筋コンクリート造	1992	50	28	I
54	59	湯之尾小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	889.29	鉄骨造	1988	38	32	I

「基礎調査結果一覧」 - 3

建物情報												重要 度
個別 計画 NO	管理 計画 NO	施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数		
54	59	湯之尾小学校	管理小屋・管理棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	314.25	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	I	
54	59	湯之尾小学校	給食室・調理室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	167.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	I	
55	60	菱刈小学校	校舎 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,462.60	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1989	50	31	I	
55	60	菱刈小学校	給食室・調理室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	218.28	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1991	50	29	I	
55	60	菱刈小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1984	38	36	I	
55	60	菱刈小学校	菱刈小学校新校舎 (木造)	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,443.00	木造	2015	24	5	I	
56	61	南永小学校	校舎・園舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	676.00	木造	2002	24	18	I	
56	61	南永小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	504.00	木造	2002	24	18	I	
57	62	本城小学校	教室棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,319.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1964	50	56	I	
57	62	本城小学校	特別教室・管理棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	880.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1986	50	34	I	
57	62	本城小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	700.00	鉄骨造	1987	38	33	I	
57	62	本城小学校	給食室・調理室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	216.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1994	50	26	I	
58	63	田中小学校	給食室・調理室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	267.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1990	50	30	I	
58	63	田中小学校	校舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,103.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1970	50	50	I	
58	63	田中小学校	校舎増築分	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	292.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1985	50	35	I	
58	63	田中小学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	698.00	鉄骨造	1986	38	34	I	
59	64	大口中央中学校	更衣室・脱衣所・ 部室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	116.00	木造	1999	24	21	I	
59	64	大口中央中学校	校舎南棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,950.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2003	50	17	I	
59	64	大口中央中学校	校舎北棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,949.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2004	50	16	I	
59	64	大口中央中学校	校舎中央棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	515.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2004	50	16	I	
59	64	大口中央中学校	格技場	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	446.00	鉄骨造	1979	38	41	I	
59	64	大口中央中学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	986.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1985	50	35	I	
59	64	大口中央中学校	校舎（その他）	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	135.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1985	50	35	I	
59	64	大口中央中学校	特別教室棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	429.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1987	50	33	I	
59	64	大口中央中学校	校舎東棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,061.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2014	50	6	I	
59	64	大口中央中学校	校舎	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	997.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2014	50	6	I	
60	65	菱刈中学校	更衣室・脱衣所・ 部室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	350.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1990	50	30	I	
60	65	菱刈中学校	格技場	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	580.00	鉄骨造	1991	38	29	I	
60	65	菱刈中学校	普通教室棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	3,145.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1968	50	52	I	
60	65	菱刈中学校	特別教室棟	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,673.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1969	50	51	I	
60	65	菱刈中学校	給食室・調理室	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	124.00	鉄骨造	1968	38	52	I	
60	65	菱刈中学校	倉庫 1	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	196.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1968	50	52	I	
60	65	菱刈中学校	体育館	教育委員会 総務課	5 学校教育系施設	1,092.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1970	50	50	I	
61	162	伊佐市立学校給食センター (新)	給食センター	教育委員会 学校給食セ ンター	5 学校教育系施設	1,594.50	鉄骨造	2010	38	10	I	
61	162	伊佐市立学校給食センター (新)	車庫・駐車場	教育委員会 学校給食セ ンター	5 学校教育系施設	130.00	鉄骨造	2010	38	10	I	
62	68	総合交流拠点施設	校舎 1	企画政策課	6 子育て支援施設	1,647.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1970	50	50	Ⅱ	
62	68	総合交流拠点施設	校舎 2	企画政策課	6 子育て支援施設	2,169.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1971	50	49	Ⅱ	
62	68	総合交流拠点施設	格技場	企画政策課	6 子育て支援施設	305.00	鉄骨造	1977	38	43	Ⅱ	
62	68	総合交流拠点施設	体育館	企画政策課	6 子育て支援施設	1,000.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1972	50	48	Ⅱ	
63	69	本城幼稚園	幼稚園	教育委員会 総務課	6 子育て支援施設	252.00	木造	1997	24	23	I	
64	160	子ども交流支援センター	療育・相談施設 1	こども課	6 子育て支援施設	420.66	木造	2010	24	10	I	
64	160	子ども交流支援センター	療育・相談施設 2	こども課	6 子育て支援施設	107.64	軽量鉄骨造	2010	26	10	I	
65	161	トータルサポートセンター	療育・相談施設	こども課	6 子育て支援施設	160.00	木造	2011	24	9	Ⅲ	
66	81-2	山野西住宅	教職員住宅 2	建設課	7 公営住宅	81.10	木造	2000	24	20	Ⅲ	

「基礎調査結果一覧」 - 4

建物情報											重要 度
個別 計画 NO	管理 計画 NO	施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	
67	86-1	羽月北住宅(旧羽月北小教職員住宅)	羽月北住宅 1 号	建設課	7 公営住宅	62.53	木造	1985	24	35	Ⅱ
67	86-1	羽月北住宅(旧羽月北小教職員住宅)	羽月北住宅 2 号	建設課	7 公営住宅	62.53	木造	1986	24	34	Ⅱ
68	106	元町団地	1 号棟 (4 F)	建設課	7 公営住宅	1,122.11	鉄筋コンクリート造	1984	50	36	Ⅱ
68	106	元町団地	2 号棟 (4 F)	建設課	7 公営住宅	1,122.11	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	Ⅱ
69	107	下殿団地	1 7 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリートブロック造	1969	41	51	Ⅲ
70	108	大田団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	208.56	コンクリートブロック造	1955	41	65	Ⅲ
71	109	水ノ手団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	208.56	コンクリートブロック造	1955	41	65	Ⅲ
72	110	小水流団地	1 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	Ⅱ
72	110	小水流団地	2 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	Ⅱ
72	110	小水流団地	3 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	Ⅱ
72	110	小水流団地	4 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	Ⅱ
72	110	小水流団地	5 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	Ⅱ
72	110	小水流団地	6 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	Ⅱ
72	110	小水流団地	7 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	Ⅱ
72	110	小水流団地	8 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	Ⅱ
72	110	小水流団地	9 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	Ⅱ
72	110	小水流団地	10 号棟	建設課	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	Ⅱ
73	112	高校西団地	集会所	建設課	7 公営住宅	127.24	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	Ⅱ
73	112	高校西団地	3 号棟	建設課	7 公営住宅	2,464.56	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	Ⅱ
73	112	高校西団地	4 号棟	建設課	7 公営住宅	1,583.89	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	Ⅱ
73	112	高校西団地	渡り廊下	建設課	7 公営住宅	169.61	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	Ⅱ
74	113	下之馬場団地	1 号棟	建設課	7 公営住宅	385.14	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	Ⅱ
74	113	下之馬場団地	2 号棟	建設課	7 公営住宅	320.95	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	Ⅱ
74	113	下之馬場団地	3 号棟	建設課	7 公営住宅	254.24	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
74	113	下之馬場団地	4 号棟	建設課	7 公営住宅	190.68	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
74	113	下之馬場団地	5 号棟	建設課	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
74	113	下之馬場団地	6 号棟	建設課	7 公営住宅	190.68	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
75	114	曾木団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	Ⅱ
76	115	針持団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	Ⅱ
77	116	崎山団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	Ⅱ
78	117	郡山団地	1 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
78	117	郡山団地	2 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
78	117	郡山団地	3 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	215.40	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	Ⅱ
78	117	郡山団地	4 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	167.52	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
78	117	郡山団地	5 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
78	117	郡山団地	6 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	215.40	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	Ⅱ
78	117	郡山団地	7 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	231.28	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
78	117	郡山団地	8 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	215.40	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	Ⅱ
78	117	郡山団地	9 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
78	117	郡山団地	10 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	223.36	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
78	117	郡山団地	11 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
78	117	郡山団地	12 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	167.52	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
78	117	郡山団地	13 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	167.52	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
78	117	郡山団地	14 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	111.68	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
78	117	郡山団地	15 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	223.36	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
78	117	郡山団地	16 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	186.60	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅱ
78	117	郡山団地	17 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅱ
78	117	郡山団地	18 号棟 2 F	建設課	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅱ

「基礎調査結果一覧」 - 5

建物情報											重要度
個別計画NO	管理計画NO	施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積(m ²)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	
78	117	郡山団地	19号棟 2F	建設課	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅱ
78	117	郡山団地	20号棟 2F	建設課	7 公営住宅	254.24	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
78	117	郡山団地	21号棟 2F	建設課	7 公営住宅	317.80	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
78	117	郡山団地	22号棟 2F	建設課	7 公営住宅	256.76	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	Ⅱ
78	117	郡山団地	23号棟 2F	建設課	7 公営住宅	256.76	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	Ⅱ
78	117	郡山団地	24号棟 2F	建設課	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅱ
78	117	郡山団地	25号棟 2F	建設課	7 公営住宅	254.24	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
78	117	郡山団地	26号棟 2F	建設課	7 公営住宅	317.80	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	Ⅱ
78	117	郡山団地	27号棟 2F	建設課	7 公営住宅	192.57	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	Ⅱ
79	118	平出水団地	1号棟	建設課	7 公営住宅	135.80	木造	1992	24	28	Ⅱ
79	118	平出水団地	2号棟	建設課	7 公営住宅	129.18	木造	1992	24	28	Ⅱ
79	118	平出水団地	3号棟	建設課	7 公営住宅	135.80	木造	1992	24	28	Ⅱ
79	118	平出水団地	4号棟	建設課	7 公営住宅	149.42	木造	2000	24	20	Ⅱ
79	118	平出水団地	5号棟	建設課	7 公営住宅	149.42	木造	2000	24	20	Ⅱ
80	119	前目第1団地	市営住宅1	建設課	7 公営住宅	277.34	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
80	119	前目第1団地	市営住宅2	建設課	7 公営住宅	277.34	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	Ⅱ
81	120	前目第2団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	137.39	木造	1992	24	28	Ⅱ
81	120	前目第2団地	前目第2住宅(25-3・4)	建設課	7 公営住宅	156.68	木造	2000	24	20	Ⅱ
81	120	前目第2団地	前目第2住宅(25-5・6)	建設課	7 公営住宅	156.68	木造	2000	24	20	Ⅱ
81	120	前目第2団地	前目第2住宅(25-7・8)	建設課	7 公営住宅	156.68	木造	2000	24	20	Ⅱ
82	121	池田団地	市営住宅1	建設課	7 公営住宅	233.56	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
82	121	池田団地	市営住宅2	建設課	7 公営住宅	233.56	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
82	121	池田団地	市営住宅3	建設課	7 公営住宅	116.78	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
83	122	瓜ノ峰第1団地	市営住宅1	建設課	7 公営住宅	298.55	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	Ⅱ
83	122	瓜ノ峰第1団地	市営住宅2	建設課	7 公営住宅	298.55	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	Ⅱ
84	123	湯之尾団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	815.31	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅱ
85	124	中央団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	841.58	鉄筋コンクリート造	1990	50	30	Ⅱ
86	125	重留西第1団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	1,158.80	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	Ⅱ
87	126	重留西第2団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	1,201.00	鉄筋コンクリート造	1992	50	28	Ⅱ
88	127	前目麓団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	1,247.40	鉄筋コンクリート造	1993	50	27	Ⅱ
89	128	瓜ノ峰第2団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	901.48	鉄筋コンクリート造	1994	50	26	Ⅱ
90	129	北俣団地	市営住宅	建設課	7 公営住宅	1,005.42	鉄筋コンクリート造	1997	50	23	Ⅱ
91	130	中水流住宅	単独住宅	建設課	7 公営住宅	119.30	木造	2002	24	18	Ⅲ
92	131	大口里住宅	単独住宅	建設課	7 公営住宅	103.80	木造	1964	24	56	Ⅲ
93	132	こっから団地	A棟	建設課	7 公営住宅	353.74	木造	1999	24	21	Ⅱ
93	132	こっから団地	B棟	建設課	7 公営住宅	353.74	木造	1999	24	21	Ⅱ
93	132	こっから団地	C棟	建設課	7 公営住宅	353.74	木造	1999	24	21	Ⅱ
93	132	こっから団地	D棟	建設課	7 公営住宅	353.74	木造	1998	24	22	Ⅱ
93	132	こっから団地	E棟	建設課	7 公営住宅	353.74	木造	1998	24	22	Ⅱ
93	132	こっから団地	F棟	建設課	7 公営住宅	287.18	木造	1999	24	21	Ⅱ
93	132	こっから団地	G棟	建設課	7 公営住宅	287.18	木造	1998	24	22	Ⅱ
94	133	ウッドタウン薔刈	ウッドタウン薔刈1号棟	建設課	7 公営住宅	172.50	木造	1999	24	21	Ⅱ
94	133	ウッドタウン薔刈	ウッドタウン薔刈2号棟	建設課	7 公営住宅	164.02	木造	1999	24	21	Ⅱ
94	133	ウッドタウン薔刈	ウッドタウン薔刈4号棟	建設課	7 公営住宅	164.02	木造	1999	24	21	Ⅱ
94	133	ウッドタウン薔刈	ウッドタウン薔刈9号棟	建設課	7 公営住宅	164.02	木造	1999	24	21	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅(10-1, -2)1棟2戸	建設課	7 公営住宅	155.64	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅(9-1, -2)1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ

「基礎調査結果一覧」 - 6

個別 計画 NO	管理計 画 NO	施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	重要 度
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（8-1, -2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（7-1, -2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（6-1, 6-2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（5-1, 5-2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（4-1, 4-2）	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（3-1, 3-2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（2-1, 2-2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅（1-1, 1-2）1棟2戸	建設課	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	Ⅱ
96	111-1	西水流団地 1	4 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1968	41	52	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	5 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1968	41	52	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	6 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1968	41	52	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	7 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1967	41	53	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	8 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1967	41	53	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 0 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1967	41	53	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 1 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1967	41	53	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 2 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 5 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 6 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 7 号棟	建設課	7 公営住宅	150.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 3 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 4 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 8 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	1 9 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
96	111-1	西水流団地 1	2 0 号棟	建設課	7 公営住宅	132.00	コンクリート〃珪砂造	1966	41	54	Ⅲ
97	111-2	西水流団地 2	2 1 号棟 4 F	建設課	7 公営住宅	1,630.59	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	Ⅱ
98	71	下殿南住宅	教職員住宅	建設課	7 公営住宅	69.94	木造	1981	24	39	Ⅲ
99	8	十曾青少年旅行村	集会所	伊佐 P R 課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	301.00	木造	1997	24	23	Ⅱ
100	10	旧布計小学校	旧布計小学校	伊佐 P R 課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	496.58	木造	1940	24	80	Ⅲ
101	12	楠本川溪流自然公園	管理小屋・管理棟	伊佐 P R 課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	181.67	木造	1993	24	27	Ⅱ
102	16	大口温泉高熊荘	浴場	長寿介護課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	343.11	鉄筋コンクリート造	1986	50	34	Ⅱ
103	42	総合運動公園	総合体育館	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	3,320.87	鉄筋コンクリート造	1973	50	47	Ⅰ
103	42	総合運動公園	メインスタンド	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	680.08	鉄筋コンクリート造	1969	50	51	Ⅰ
103	42	総合運動公園	弓道場	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	393.66	木造	1986	24	34	Ⅰ
103	42	総合運動公園	野球場メインスタンド・観覧席	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	140.00	鉄筋コンクリート造	1974	50	46	Ⅰ
103	42	総合運動公園	屋外プール	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	173.50	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	Ⅰ
103	42	総合運動公園	体育センター	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	978.00	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	Ⅰ
104	44-1	農村公園	トレーニングセンター	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	1,655.07	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	Ⅰ
104	44-1	農村公園	競技場・スタンド	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	235.73	木造	1990	24	30	Ⅰ

「基礎調査結果一覧」 - 7

個別 計画 NO	管理 計画 NO	建物情報									重要 度
		施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	
105	45	カヌー艇庫	船庫・船小屋	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	199.12	鉄骨造	2009	38	11	I
105	45	カヌー艇庫	艇庫	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	384.27	鉄骨造	2017	38	3	I
105	45	カヌー艇庫	事務所	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	575.57	鉄骨造	2017	38	3	I
106	46	湯之尾体育広場カヌー艇庫	船庫・船小屋	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	111.07	鉄骨造	1989	38	31	III
107	47	湯之尾屋内ゲートボール場	競技場・スタンド	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	1,510.00	鉄骨造	1987	38	33	II
108	67	山野地区体育館	体育館	スポーツ推進課	8 スポーツ・レクリエーション系施設	727.00	鉄骨造	1980	38	40	III
109	7	轟公園	一般事務所	伊佐PR課(建設課)	9 公園	171.83	鉄筋コンクリート造	1997	50	23	III
110	13	曾木の滝公園	案内施設	伊佐PR課(建設課)	9 公園	123.83	木造	2011	24	9	III
111	9	伊佐市夢さくら館敷地	店舗	伊佐PR課	10 産業系施設	423.18	木造	1998	24	22	III
112	11	伊佐市ひしかり交流館	多目的複合施設	伊佐PR課	10 産業系施設	342.00	木造	2000	24	20	II
113	142	大口生活改善センター	給食室・調理室	農政課	10 産業系施設	355.80	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	III
114	144	菱刈生活改善センター	集会所	農政課	10 産業系施設	310.31	鉄骨造	1979	38	41	III
115	145	菱刈農畜産物処理加工施設	給食室・調理室 1	農政課	10 産業系施設	99.00	鉄骨造	1979	38	41	III
115	145	菱刈農畜産物処理加工施設	給食室・調理室 2	農政課	10 産業系施設	77.90	鉄骨造	1979	38	41	III
116	146	山ノ神堆肥センター	堆肥舎 1	農政課	10 産業系施設	2,622.96	鉄骨造	2009	38	11	I
116	146	山ノ神堆肥センター	堆肥舎 2	農政課	10 産業系施設	2,024.37	鉄骨造	2009	38	11	I
116	146	山ノ神堆肥センター	堆肥舎 3	農政課	10 産業系施設	2,142.00	鉄骨造	2009	38	11	I
117	135	平出水集落排水施設	処理場	建設課	11 下水道施設	123.87	鉄筋コンクリート造	2003	50	17	I
118	137	農業集落排水施設	菱刈北部地区	建設課	11 下水道施設	847.00	鉄筋コンクリート造	1997	50	23	I
119	138	一般廃棄物最終処分場	宮人処分場処理棟	環境政策課	12 供給処理施設	225.00	鉄骨造	1987	38	33	I
120	139	大口リサイクルプラザ	粗大ごみ処理施設	環境政策課	12 供給処理施設	1,616.07	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	I
120	139	大口リサイクルプラザ	機械室・機械棟	環境政策課	12 供給処理施設	130.00	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	I
120	139	大口リサイクルプラザ	浸出水処理施設	環境政策課	12 供給処理施設	653.08	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	I
121	140	牛尾湧水処理施設	一般事務所	環境政策課	12 供給処理施設	114.40	鉄骨造	1988	38	32	I
122	165	旧伊佐市衛生センター	一般事務所	環境政策課	12 供給処理施設	256.00	鉄筋コンクリート造	1991	50	29	III
123	165	(きりり館) 伊佐市衛生センター	処理棟	環境政策課	12 供給処理施設	1,717.63	鉄筋コンクリート造	2017	50	3	I
123	165	(きりり館) 伊佐市衛生センター	車庫棟	環境政策課	12 供給処理施設	112.00	鉄骨造	2017	38	3	I
124	18	伊佐市菱刈生活支援ハウス	養護施設	長寿介護課	13 その他	818.00	鉄筋コンクリート造	1993	50	27	III
125	73	大口小学校長住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	69.94	木造	1982	24	38	II
126	74	大口小教頭住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	92.98	木造	1979	24	41	II
127	75	大口東小教頭住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	69.94	木造	1979	24	41	II
128	76	大口東小校長住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	76.18	木造	1995	24	25	II
129	77	牛尾小教頭住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	63.59	木造	1994	24	26	II
130	78	牛尾小学校長住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	85.98	木造	1998	24	22	II
131	80	山野小学校長住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	78.90	木造	1995	24	25	II
132	82	平出水小学校長住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	69.94	木造	1978	24	42	II
133	83	平出水小教頭住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	64.49	木造	1991	24	29	II
134	84	羽月小学校長住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	87.69	木造	1999	24	21	II
135	85	羽月小教頭住宅	教職員住宅	教育委員会総務課	13 その他	84.33	木造	2000	24	20	II
136	88	羽月西小教職員住宅	教職員住宅 1	教育委員会総務課	13 その他	63.07	木造	1994	24	26	II
136	88	羽月西小教職員住宅	教職員住宅 2	教育委員会総務課	13 その他	70.13	木造	1979	24	41	II
137	89	曾木小教職員住宅	曾木小学校長住宅	教育委員会総務課	13 その他	70.13	木造	1981	24	39	II
137	89	曾木小教職員住宅	曾木小教頭住宅	教育委員会総務課	13 その他	70.13	木造	1980	24	40	II

「基礎調査結果一覧」 - 8

個別 計画 NO	管理 計画 NO	建物情報									重要 度
		施設名称	建物名称	所属課	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	
138	91	大口中央教職員住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	84.81	木造	2003	24	17	Ⅱ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅4号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	Ⅲ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅5号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	Ⅲ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅6号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	Ⅲ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅7号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	Ⅲ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅1号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1972	24	48	Ⅲ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅2号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1972	24	48	Ⅲ
139	92	第2菱刈教職員住宅	第2菱刈教職員住宅3号	教育委員会 総務課	13 その他	52.25	木造	1972	24	48	Ⅲ
140	94	菱刈小学校校長・教頭住宅	菱刈小学校校長住宅	教育委員会 総務課	13 その他	101.23	木造	1994	24	26	Ⅱ
140	94	菱刈小学校校長・教頭住宅	菱刈小学校教頭住宅	教育委員会 総務課	13 その他	93.48	木造	1994	24	26	Ⅱ
141	95	湯之尾小学校校長住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	92.50	木造	1996	24	24	Ⅱ
142	96	湯之尾小教職員住宅	湯之尾教職員住宅(1号)	教育委員会 総務課	13 その他	72.04	木造	1989	24	31	Ⅲ
142	96	湯之尾小教職員住宅	湯之尾教職員住宅(2号)	教育委員会 総務課	13 その他	72.04	木造	1989	24	31	Ⅲ
143	97	南永小学校校長住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	92.50	木造	1996	24	24	Ⅱ
144	98	南永教職員住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	92.50	木造	1997	24	23	Ⅱ
145	99	前目麓教職員住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	256.78	木造	1996	24	24	Ⅲ
146	100	本城小学校校長住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	92.50	木造	1997	24	23	Ⅱ
147	101	本城小教職員住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	73.72	木造	1983	24	37	Ⅲ
148	102	前目教職員住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	60.16	木造	1970	24	50	Ⅲ
149	103	菱刈中学校校長住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	124.21	木造	1988	24	32	Ⅱ
150	104	教育長住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	82.65	木造	2002	24	18	Ⅱ
151	105	学校教育課長住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	89.64	木造	1972	24	48	Ⅱ
152	136	大型車庫施設	車庫・駐車場 1	建設課(道路 維持)	13 その他	243.40	鉄骨造	1983	38	37	Ⅲ
153	79-1	山野小学校教頭住宅	教職員住宅	教育委員会 総務課	13 その他	69.94	木造	1983	24	37	Ⅱ
154	79-2	山野境目住宅(山野中学校 教頭住宅)	教職員住宅 1	建設課	13 その他	69.94	木造	1977	24	43	Ⅲ
154	79-2	山野境目住宅(山野中学校 教頭住宅)	教職員住宅 2	建設課	13 その他	69.94	木造	1983	24	37	Ⅲ
155	90-1	針持小教職員住宅 1	針持小校長住宅	教育委員会 総務課	13 その他	69.94	木造	1978	24	42	Ⅱ
156	90-2	針持小教職員住宅 2	針持小教頭住宅	教育委員会 総務課	13 その他	73.70	木造	1995	24	25	Ⅱ
157	2	営公アパレル工場貸付地	工場	財政課	14 普通財産	1,322.75	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	Ⅱ
158	3	淡水養魚場	一般事務所	財政課	14 普通財産	226.76	木造	1960	24	60	Ⅲ
158	3	淡水養魚場	作業所	財政課	14 普通財産	190.53	軽量鉄骨造	1970	26	50	Ⅲ
159	4	羽月西土地改良区貸付地	作業所	財政課	14 普通財産	139.12	木造	1978	24	42	Ⅲ
160	5	本城校区コミュニティ貸付地(旧 本城駐在所)	本城駐在所	財政課	14 普通財産	102.68	木造	1997	24	23	Ⅲ
161	19	伊佐市シルバー人材センター ワークプラザ	庁舎	長寿介護課	14 普通財産	318.33	鉄筋コンクリート造	1969	50	51	Ⅲ
162	55	羽月北小学校	校舎・園舎	教育委員会 総務課	14 普通財産	436.00	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	Ⅲ
162	55	羽月北小学校	体育館	教育委員会 総務課	14 普通財産	608.00	鉄筋コンクリート造	1996	50	24	Ⅲ
163	66	山野中跡地	校舎 1	教育委員会 総務課	14 普通財産	1,796.00	鉄筋コンクリート造	1972	50	48	Ⅲ
163	66	山野中跡地	校舎 2	教育委員会 総務課	14 普通財産	617.00	鉄筋コンクリート造	1960	50	60	Ⅲ
163	66	山野中跡地	格技場	企画政策課 政策課	14 普通財産	305.00	鉄骨造	1978	38	42	Ⅲ
164	72	曾木公売地	(旧)大口南中教 職員住宅	財政課	14 普通財産	63.06	木造	1992	24	28	Ⅲ
165	81-1	(株)かいたく貸付地(山野 西住宅)	教職員住宅 1	財政課	14 普通財産	56.82	木造	2000	24	20	Ⅲ
166	86-2	羽月北校区コミュニティ貸 付(旧羽月北小教職員住宅)	羽月北住宅 3号	財政課	14 普通財産	62.53	木造	1986	24	34	Ⅲ
167	151	ひまわり福祉会貸付地(旧 伊佐市大口心身障害者等福 祉センター)	多目的福祉施設	財政課	14 普通財産	351.11	コンクリートブロック造	1972	41	48	Ⅱ

第2節 一次評価（健全度）

健全度は、対象施設の5つの部位（屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備）について近接目視による建物の劣化状況を点検し、以下の調査票を用いて実施しました。4段階で評価し100点満点で数値化しています。なお、今後も3年～5年の周期で定期的に調査点検を行い、不具合・危険箇所の早期発見に努めることとします。

調査票

部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新) 工事内容	劣化状況 (複数回答可)	箇所数	特記事項	評価
1 屋根 屋上	☐ アスファルト保護防水		☐ 降雨時に雨漏りがある			C
	☐ アスファルト露出防水		☐ 天井等に雨漏り跡がある			
	☐ シート防水、塗膜防水		☐ 防水層に膨れ・破れがある			
	☐ 勾配屋根(長尺金属板、折板)		☐ 屋根葺材に錆・損傷がある			
	☐ 勾配屋根(スレート、瓦類)		☐ 笠木・立上り等に損傷がある			
	☐ その他の屋根()		☐ 樋やルーフ・ドレンを目視点検できない			
	最終工事年度	0	☐ 既存点検等で指摘がある			
2 外壁	☐ 塗仕上げ		☐ 鉄筋が見えているところがある			D
	☐ タイル張り、石張り		☐ 外壁から漏水がある			
	☐ 金属系パネル		☐ 塗装の剥がれ			
	☐ コンクリート系パネル(ALC等)		☐ タイルや石が剥がれている			
	☐ その他の外壁()		☐ 大きな亀裂がある			
	☐ アルミ製サッシ		☐ 窓・ドアの廻りで漏水がある			
	☐ 鋼製サッシ		☐ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある			
	☐ 断熱サッシ、省エネガラス		☐ 外部手すり等の錆・腐朽			
	最終工事年度	0	☐ 既存点検等で指摘がある			

部位	改修・点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	☐ 老朽改修			C
	☐ エコ改修			
	☐ トイレ改修			
	☐ 法令適合			
	☐ LAN			
	☐ 空調設置			
	☐ バリアフリー対策			
	☐ 防犯対策			
	☐ 構造体の耐震対策			
	☐ 非構造部材の耐震対策			
	☐ その他、内部改修工事			
4 電気設備	☐ 分電盤改修			C
	☐ 配線等の敷設工事			
	☐ 昇降設備保守点検			
	☐ その他、電気設備改修工事			
5 機械設備	☐ 給水配管改修			C
	☐ 排水配管改修			
	☐ 消防設備の点検			
	☐ その他、機械設備改修工事			

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)

健全度
31
100点
自動算定

【学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書】

評価基準や、健全度に関する説明は以下のとおりです。

評価基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

評価	基準
良好 A	概ね良好
B	部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C	広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)
劣化 D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えている) (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等

経過年数による評価

【内部仕上げ、電気設備、機械設備】

評価	基準
良好 A	20年未満
B	20～40年
C	40年以上
劣化 D	経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合

健全度の算定

健全度とは、各建物の5つの部位について劣化状況を4段階で評価し、100点満点で数値化した評価指標である。①部位の評価点と②部位のコスト配分を下表のように定め、③健全度を100点満点で算定する。なお、②部位のコスト配分は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率算定表を参考に、同算定表における「長寿命化」の7%分を、屋根・屋上、外壁に按分して設定している。

①部位の評価点

	評価点
A	100
B	75
C	40
D	10

②部位のコスト配分

部位	コスト配分
1 屋根・屋上	5.1
2 外壁	17.2
3 内部仕上げ	22.4
4 電気設備	8.0
5 機械設備	7.3
計	60

③健全度

$$\text{総和(部位の評価点} \times \text{部位のコスト配分)} \div 60$$

※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。

(右図「劣化状況調査票」記入例における健全度計算例)

	評価	評価点	配分	
1 屋根・屋上	C	40	5.1	204
2 外壁	D	10	17.2	172
3 内部仕上げ	B	75	22.4	1,680
4 電気設備	A	100	8.0	800
5 機械設備	C	40	7.3	292
計				3,148
				÷ 60
				健全度 52

※健全度が40点未満なら優先的に対策を講じることが望ましく、健全度の点数に関わらず、C、D評価の部位は、早急に修繕・改修することが望ましい。

【学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書】

第3節 二次評価（保全優先度判定）

対象施設の健全度・重要度をもとに、保全優先度を判定します。

④群に分類した施設が最も保全優先度が高く、⑩群以降は、アルファベット順に優先度は低くなり、①群に分類した施設は保全優先度が最も低いことを表しています。

保全優先度を参考に今後 10 年間の計画期間の中で具体的に実施していく時期を設定します。

保全優先度判定表

	健全度 40 点未満	健全度 40～50 点未満	健全度 50～60 点未満	健全度 60 点以上
施設重要度Ⅰ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
施設重要度Ⅱ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
施設重要度Ⅲ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ

第4章 対策内容の設定

第1節 対策内容一覧

計画期間内の対策内容として、以下の手法があります。

対策内容一覧

対策内容	説明
建替え	既存建物を解体・撤去し、新たに建物を建築する。
大規模改修 (長寿命化改修)	公共建築物の主要構造部の改修を行う。 施設機能性や耐久性を高めるための工事を行い、ライフサイクルコストの軽減、利便性の向上につなげる。
部位修繕	劣化が著しい部位の修繕を行う。 大規模改修に比べ、改修箇所が限定される。
解体	利用されていない施設、不要な施設・危険施設の機能を停止し、取り壊しを行う。
簡易補修	部位修繕ほど費用をかけず、簡易的な補修のみを行う。

なお、計画期間内に対策を予定していない施設については「簡易補修」とし費用算定は行わず、対策の必要が生じた時点で適宜見直すこととします。

第2節 対策内容検討

二次評価（保全優先度判定表）を参考にエリア分けを行い、それぞれの傾向に合わせて評価し対策内容を検討します。

保全優先度判定表

	健全度 40 点未満	健全度 40～50 点未満	健全度 50～60 点未満	健全度 60 点以上
施設重要度Ⅰ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
施設重要度Ⅱ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
施設重要度Ⅲ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ

保全優先度判定は、上記 ①～④ にエリア分けを行い、以下の対策を検討します。

- ①：重要度が高く、健全度が低いため、早期の対策が必要です。対策については、建替え、大規模改修、部位修繕を中心に検討します。
- ②：重要度・健全度ともに高いため、大規模改修、部位修繕、簡易補修を中心に検討します。
- ③：重要度・健全度ともに低いため、解体や簡易補修を中心に検討します。
- ④：重要度は低いですが、健全度が高いため、対策の優先度は低い。簡易補修を中心に検討します。

第3節 対策内容の設定

一次評価・二次評価結果および「総合管理計画における基本方針」をもとに、計画期間内の対策内容を設定するものとします。

「二次評価結果」（重要度Ⅰ）

	健全度 40 点未満			健全度 40 点以上 50 点未満			健全度 50 点以上 60 点未満			健全度 60 点以上											
	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全度			
重要度 Ⅰ	47	牛尾小学校_校舎・園舎 1	22	1	伊佐市役所大口庁舎_庁舎_本館	40	38	文化会館_文化会館	53	2	伊佐市役所菱刈庁舎_庁舎	75	51	羽月西小学校_校舎・園舎 1	84	60	菱刈中学校_格技場	82			
	47	牛尾小学校_校舎・園舎 2	22	1	伊佐市役所大口庁舎_庁舎_別館	43	45	大口小学校_校舎 3	55	2	伊佐市役所菱刈庁舎_公用車車庫（庁舎北側 2）	84	51	羽月西小学校_校舎・園舎 2	100	60	菱刈中学校_普通教室棟	93			
	48	山野小学校_校舎 1	17	1	伊佐市役所大口庁舎_車庫・駐車場	40	51	羽月西小学校_体育館	53	2	伊佐市役所菱刈庁舎_庁舎倉庫（庁舎東側 2）	84	52	曾木小学校_体育館	75	60	菱刈中学校_特別教室棟	100			
	48	山野小学校_校舎 2	31	45	大口小学校_校舎 1	47	53	針持小学校_体育館	59	6	第 9 分団消防詰所_詰所	100	52	曾木小学校_校舎・園舎	72	60	菱刈中学校_給食室・調理室	100			
	57	本城小学校_教室棟	37	45	大口小学校_校舎 2	47	58	田中小学校_校舎	51	7	第 1 0 分団消防詰所_詰所	100	53	針持小学校_校舎(旧幼稚園)	62	60	菱刈中学校_倉庫 1	62			
	59	大口中央中学校_格技場	17	49	平出水小学校_校舎・園舎	43	58	田中小学校_体育館	59	8	第 3 分団消防詰所_詰所	100	53	針持小学校_校舎	62	60	菱刈中学校_体育館	60			
	103	総合運動公園_メインスタンド	34	103	総合運動公園_総合体育館	40	103	総合運動公園_体育センター	52	9	第 8 分団消防詰所_詰所	100	54	湯之尾小学校_校舎・園舎	82	61	伊佐市立学校給食センター（新）_給食センター	100			
	103	総合運動公園_野球場メインスタンド・観覧席	14	あ			119	一般廃棄物最終処分場_宮人処分場処理棟	53	11	第 4 分団消防詰所_詰所	100	54	湯之尾小学校_体育館	72	61	伊佐市立学校給食センター（新）_車庫・駐車場	100			
	103	総合運動公園_屋外プール	10				12	第 7 分団消防詰所_詰所	100	54	湯之尾小学校_管理小屋・管理棟	75	63	本城幼稚園_幼稚園	83						
	A									13	第 2 分団消防詰所_2 分団消防詰所	100	54	湯之尾小学校_給食室・調理室	82	64	子ども交流支援センター_療育・相談施設 1	100			
										15	ふれあいセンター_集会所	65	55	菱刈小学校_校舎 1	75	64	子ども交流支援センター_療育・相談施設 2	100			
										15	ふれあいセンター_資料館	65	55	菱刈小学校_給食室・調理室	75	103	総合運動公園_弓道場	77			
										15	ふれあいセンター_図書館	65	55	菱刈小学校_体育館	62	104	農村公園_トレーニングセンター	71			
										15	ふれあいセンター_事務所	65	55	菱刈小学校_菱刈小学校新校舎（木造）	100	104	農村公園_競技場・スタンド	75			
										15	ふれあいセンター_店舗	65	56	南永小学校_校舎・園舎	100	105	カヌー艇庫_船庫・船小屋	100			
										39	菱刈環境改善センター_市民センター	75	56	南永小学校_体育館	93	105	カヌー艇庫_艇庫	100			
										39	菱刈環境改善センター_野外ステージ	62	57	本城小学校_特別教室・管理棟	72	105	カヌー艇庫_事務所	100			
										45	大口小学校_校舎 4	67	57	本城小学校_体育館	72	116	山ノ神堆肥センター_堆肥舎 1	100			
										45	大口小学校_校舎 5	67	57	本城小学校_給食室・調理室	75	116	山ノ神堆肥センター_堆肥舎 2	100			
										45	大口小学校_体育館	100	58	田中小学校_給食室・調理室	75	116	山ノ神堆肥センター_堆肥舎 3	100			
										46	大口東小学校_校舎・園舎_管理教室棟	62	58	田中小学校_校舎増築分	62	117	平出水集落排水施設_処理場	100			
										46	大口東小学校_校舎・園舎_特別教室棟	62	59	大口中央中学校_更衣室・脱衣所・部室	75	118	農業集落排水施設_菱刈北部地区	84			
										46	大口東小学校_体育館	62	59	大口中央中学校_校舎南棟	100	120	大口リサイクルプラザ_粗大ごみ処理施設	75			
										47	牛尾小学校_音楽室	100	59	大口中央中学校_校舎北棟	100	120	大口リサイクルプラザ_機械室・機械棟	75			
										47	牛尾小学校_体育館	67	59	大口中央中学校_校舎中央棟	100	120	大口リサイクルプラザ_浸出水処理施設	75			
										48	山野小学校_校舎 3	62	59	大口中央中学校_体育館	72	121	牛尾湧水処理施設_一般事務所	75			
										48	山野小学校_体育館	75	59	大口中央中学校_校舎（その他）	72	123	（きらり館）伊佐市衛生センター_処理棟	100			
										49	平出水小学校_体育館	75	59	大口中央中学校_特別教室棟	72	123	（きらり館）伊佐市衛生センター_車庫棟	100			
										50	羽月小学校_校舎 1	62	59	大口中央中学校_校舎東棟	100						
										50	羽月小学校_校舎 3	75	59	大口中央中学校_校舎	100						
										50	羽月小学校_体育館	75	60	菱刈中学校_更衣室・脱衣所・部室	75						

「二次評価結果」(重要度Ⅱ)

重要度 Ⅱ	健全度 40 点未満			健全度 40 点以上 50 点未満			健全度 50 点以上 60 点未満			健全度 60 点以上											
	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度			
	18	保健関係保管庫_多目的保健施設	10	3	防災用具倉庫（旧スクールバス車庫）_車庫・駐車場	40	23	共進地区教育集会施設_集会所	53	4	上町班消防詰所_詰所	84	73	高校西団地_渡り廊下	100	93	こつがら団地_E 棟	75			
	21	羽月地区公民館_集会所	10	20	羽月西青少年センター_集会所	40	29	針持青少年センター_集会所	56	5	星町班消防詰所_詰所	77	74	下之馬場団地_1 号棟	75	93	こつがら団地_F 棟	75			
	78	郡山団地_1 号棟 2 F	29	25	山野西文化交流館_校舎・園舎	40	41	西太良コミュニティセンター_集会所	55	14	菱刈ふるさといきがいセンター_図書館	65	74	下之馬場団地_2 号棟	75	93	こつがら団地_G 棟	75			
	78	郡山団地_2 号棟 2 F	29	62	総合交流拠点施設_校舎 1	40	42	山野基幹集落センター_山野基幹集落センター	53	14	菱刈ふるさといきがいセンター_生涯学習	65	74	下之馬場団地_3 号棟	75	94	ウッドタウン菱刈_ウッドタウン菱刈 1 号棟	84			
	78	郡山団地_3 号棟 2 F	29	62	総合交流拠点施設_校舎 2	40	125	大口小校長住宅_教職員住宅	56	14	菱刈ふるさといきがいセンター_資料館	65	74	下之馬場団地_4 号棟	75	94	ウッドタウン菱刈_ウッドタウン菱刈 2 号棟	84			
	78	郡山団地_4 号棟 2 F	29	62	総合交流拠点施設_校舎 1	40				16	伊佐市大口元気こころ館_多目的福祉施設	75	74	下之馬場団地_5 号棟	75	94	ウッドタウン菱刈_ウッドタウン菱刈 4 号棟	84			
	78	郡山団地_5 号棟 2 F	29	62	総合交流拠点施設_校舎 2	40				17	伊佐市菱刈総合保健福祉センター_歩行浴場	75	74	下之馬場団地_6 号棟	75	94	ウッドタウン菱刈_ウッドタウン菱刈 9 号棟	84			
	78	郡山団地_6 号棟 2 F	29	62	総合交流拠点施設_格技場	40				17	伊佐市菱刈総合保健福祉センター_多目的保健施設	93	75	曾木団地_市営住宅	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（10-1、-2）1 棟 2 戸	100			
	78	郡山団地_7 号棟 2 F	29	62	総合交流拠点施設_体育館	40				17	伊佐市菱刈総合保健福祉センター_多目的福祉施設	93	76	針持団地_市営住宅	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（9-1、-2）1 棟 2 戸	100			
	78	郡山団地_8 号棟 2 F	29	80	前目第 1 団地_市営住宅 1	40				19	ひまわり館_集会所	83	77	崎山団地_市営住宅	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（8-1、-2）1 棟 2 戸	100			
	78	郡山団地_9 号棟 2 F	29	80	前目第 1 団地_市営住宅 2	40				22	牛尾青少年センター_集会所	66	78	郡山団地_1 6 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（7-1、-2）1 棟 2 戸	100			
	78	郡山団地_1 0 号棟 2 F	29										24	元町青少年会館_集会所	62	78	郡山団地_1 7 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（6-1、6-2）1 棟 2 戸	100
	78	郡山団地_1 1 号棟 2 F	29										25	山野西文化交流館_体育館	62	78	郡山団地_1 8 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（5-1、5-2）1 棟 2 戸	100
	78	郡山団地_1 2 号棟 2 F	29										26	小木原東集会所_集会所	75	78	郡山団地_1 9 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（4-1、4-2）	100
	78	郡山団地_1 3 号棟 2 F	29										27	松木原集会所_集会所	82	78	郡山団地_2 0 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（3-1、3-2）1 棟 2 戸	100
	78	郡山団地_1 4 号棟 2 F	29										28	神池集会所_集会所	75	78	郡山団地_2 1 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（2-1、2-2）1 棟 2 戸	100
	78	郡山団地_1 5 号棟 2 F	29										30	西永尾集会所_集会所	62	78	郡山団地_2 2 号棟 2 F	75	95	山田団地_改良住宅前田住宅（1-1、1-2）1 棟 2 戸	100
	82	池田団地_市営住宅 1	31										31	青木元教育集会施設_集会所	75	78	郡山団地_2 3 号棟 2 F	75	97	西水流団地_2_2 1 号棟 4 F	62
82	池田団地_市営住宅 2	31	32										曾木青少年自立自興会館_集会所	75	78	郡山団地_2 4 号棟 2 F	75	99	十曾青少年旅行村_集会所	75	
82	池田団地_市営住宅 3	31	33										大口東青少年センター_集会所	66	78	郡山団地_2 5 号棟 2 F	75	101	楠本川溪流自然公園_管理小屋・管理棟	75	
126	大口小教頭住宅_教職員住宅	36	34										田中校区集会施設_集会所	65	78	郡山団地_2 6 号棟 2 F	75	102	大口温泉高熊荘_浴場	75	
127	大口東小教頭住宅_教職員住宅	36	35	湯之尾校区集会施設_集会所	70	78				郡山団地_2 7 号棟 2 F	75	107	湯之尾屋内ゲートボール場_競技場・スタンド	72							
132	平出水小校長住宅_教職員住宅	36	36	平出水青少年センター_集会所	66	79				平出水団地_1 号棟	75	112	伊佐市ひしかり交流館_多目的複合施設	62							
136	羽月西小教職員住宅_教職員住宅 2	36	37	本城校区公民館_集会所	72	79	平出水団地_2 号棟	75	128	大口東小校長住宅_教職員住宅	84										
149	菱刈中学校校長住宅_教職員住宅	36	40	布計地区多目的集会施設_集会所	76	79	平出水団地_3 号棟	75	129	牛尾小教頭住宅_教職員住宅	84										
151	学校教育課長住宅_教職員住宅	36	43	大口富士福祉館_福祉館	75	79	平出水団地_4 号棟	75	130	牛尾小校長住宅_教職員住宅	87										
155	針持小教職員住宅 1_針持小校長住宅	36	44	菱刈人権文化センター_市民センター	84	79	平出水団地_5 号棟	75	131	山野小校長住宅_教職員住宅	82										
Ⓑ			Ⓒ			Ⓓ			67	羽月北住宅(旧羽月北小教職員住宅)_羽月北住宅 1 号	75	81	前目第 2 団地_市営住宅	84	133	平出水小教頭住宅_教職員住宅	75				
									67	羽月北住宅(旧羽月北小教職員住宅)_羽月北住宅 2 号	75	81	前目第 2 団地_前目第 2 住宅（2 5－3・4）	84	134	羽月小校長住宅_教職員住宅	100				
									68	元町団地_1 号棟（4 F）	84	81	前目第 2 団地_前目第 2 住宅（2 5－5・6）	84	135	羽月小教頭住宅_教職員住宅	100				
									68	元町団地_2 号棟（4 F）	84	81	前目第 2 団地_前目第 2 住宅（2 5－7・8）	84	136	羽月西小教職員住宅_教職員住宅 1	75				
									72	小水流団地_1 号棟	100	83	瓜ノ峰第 1 団地_市営住宅 1	62	137	曾木小教職員住宅_曾木小校長住宅	62				
									72	小水流団地_2 号棟	100	83	瓜ノ峰第 1 団地_市営住宅 2	62	137	曾木小教職員住宅_曾木小教頭住宅	62				
									72	小水流団地_3 号棟	100	84	湯之尾団地_市営住宅	84	138	大口中央中教職員住宅_教職員住宅	100				
									72	小水流団地_4 号棟	100	85	中央団地_市営住宅	84	140	菱刈小学校校長・教頭住宅_菱刈小学校校長住宅	84				
									72	小水流団地_5 号棟	100	86	重留西第 1 団地_市営住宅	84	140	菱刈小学校校長・教頭住宅_菱刈小学校教頭住宅	84				
									72	小水流団地_6 号棟	100	87	重留西第 2 団地_市営住宅	84	141	湯之尾小学校校長住宅_教職員住宅	72				
72	小水流団地_7 号棟	100	88	前目麓団地_市営住宅	62	143	南永小学校校長住宅_教職員住宅	75													
72	小水流団地_8 号棟	100	89	瓜ノ峰第 2 団地_市営住宅	75	144	南永教職員住宅_教職員住宅	75													
72	小水流団地_9 号棟	100	90	北俣団地_市営住宅	75	146	本城小学校校長住宅_教職員住宅	75													
72	小水流団地_10 号棟	100	93	こつがら団地_A 棟	75	150	教育長住宅_教職員住宅	100													
73	高校西団地_集会所	100	93	こつがら団地_B 棟	75	153	山野小学校教頭住宅_教職員住宅	62													
73	高校西団地_3 号棟	100	93	こつがら団地_C 棟	75	156	針持小教職員住宅 2_針持小教頭住宅	82													
73	高校西団地_4 号棟	100	93	こつがら団地_D 棟	75																

「二次評価結果」(重要度Ⅲ)

重要 度 Ⅲ	健全度 40 点未満			健全度 40 点以上 50 点未満			健全度 50 点以上 60 点未満			健全度 60 点以上					
	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度	個別 計画 No	施設名称_建物名称	健全 度
	10	宮人書庫_倉庫	19	91	中水流住宅_単独住宅	40	162	羽月北小学校_校舎・園舎	51	65	トータルサポートセンター_療育・相談施設	100	122	旧伊佐市衛生センター_一般事務所	64
	69	下殿団地_1 7号棟	10	92	大口里住宅_単独住宅	49	え			66	山野西住宅_教職員住宅 2	100	142	湯之尾小教職員住宅_湯之尾教職員住宅 (1号)	75
	70	大田団地_市営住宅	21	114	菱刈生活改善センター_集会所	43				98	下殿南住宅_教職員住宅	75	142	湯之尾小教職員住宅_湯之尾教職員住宅 (2号)	75
	71	水ノ手団地_市営住宅	21	124	伊佐市菱刈生活支援ハウス_養護施設	40				100	旧布計小学校_旧布計小学校	84	145	前目麓教職員住宅_教職員住宅	84
	96	西水流団地_1_4号棟	10	159	羽月西土地改良区貸付地_作業所	40				106	湯之尾体育広場カヌー艇庫_船庫・船小屋	75	147	本城小教職員住宅_教職員住宅	65
	96	西水流団地_1_5号棟	10	161	伊佐市シルバー人材センターワークプラザ_庁舎	43				109	轟公園_一般事務所	75	152	大型車庫施設_車庫・駐車場 1	62
	96	西水流団地_1_6号棟	10	163	山野中跡地_格技場	40				110	曾木の滝公園_案内施設	83	160	本城校区コミュニティ貸付地（旧本城駐在所）_本城駐在所	75
	96	西水流団地_1_7号棟	10	う						111	伊佐市夢さくら館敷地_店舗	72	162	羽月北小学校_体育館	75
	96	西水流団地_1_8号棟	10							113	大口生活改善センター_給食室・調理室	75	164	曾木公売地_（旧）大口南中教職員住宅	75
	96	西水流団地_1_10号棟	10							115	菱刈農畜産物処理加工施設_給食室・調理室 1	75	165	（株）かいたく貸付地（山野西住宅）_教職員住宅 1	84
	96	西水流団地_1_11号棟	10							115	菱刈農畜産物処理加工施設_給食室・調理室 2	75	166	羽月北校区コミュニティ貸付(旧羽月北小教職員住宅)_羽月北住宅 3号	72
	96	西水流団地_1_12号棟	10							F					
	96	西水流団地_1_15号棟	10												
	96	西水流団地_1_16号棟	10												
	96	西水流団地_1_17号棟	10												
	96	西水流団地_1_13号棟	10												
	96	西水流団地_1_14号棟	10												
	96	西水流団地_1_18号棟	10												
	96	西水流団地_1_19号棟	10												
	96	西水流団地_1_20号棟	10												
	108	山野地区体育館_体育館	17												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 4号	36												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 5号	36												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 6号	36												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 7号	36												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 1号	36												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 2号	36												
	139	第 2 菱刈教職員住宅_第 2 菱刈教職員住宅 3号	36												
148	前目教職員住宅_教職員住宅	36													
154	山野境目住宅（山野中学校長,教頭住宅）_教職員住宅 1	13													
154	山野境目住宅（山野中学校長,教頭住宅）_教職員住宅 2	21													
158	淡水養魚場_一般事務所	10													
158	淡水養魚場_作業所	10													
163	山野中跡地_校舎 1	34													
163	山野中跡地_校舎 2	34													

第5章 対策の実施時期設定・費用試算

第1節 対策費用シミュレーション方法

すでに対策内容の設計見積や概算経費が算出されている場合は、その費用を使用します。

設計費が算出されていない場合には、統一した単価により算定し今後の費用のシミュレーションを実施します。

第2節 耐用年数・建設単価の設定

公共建築物の耐用年数や改修周期、延命期間は構造により異なります。

本計画書では、総合管理計画作成時と同様の耐用年数や対策内容に応じた単価の設定を行っています。劣化度調査の結果から、屋根や外壁など特定の部位の修繕が必要と判断した場合には、それぞれの部位ごとに建替え費用に対して特定の割合の費用を乗じることで、費用推計を行っています。

構造ごとの耐用年数や、更新費用推計時の単価設定の詳細は、以下のとおりです。

(1) 耐用年数

構造	耐用年数	延命期間	大規模改修周期
鉄筋コンクリート造	50	20	20
鉄骨鉄筋コンクリート造	50	20	20
鉄骨造	38	10	20
軽量鉄骨造	26	—	—
コンクリートブロック造	41	10	20
木造	24	—	—

(2) 建替えの単価設定

構造	単価 (円/㎡)
鉄筋コンクリート造	313,000
鉄骨鉄筋コンクリート造	428,000
鉄骨造	196,000
軽量鉄骨造	175,000
コンクリートブロック造	190,000
木造	246,000

※単価については、総合管理計画作成時に使用した単価を採用（建築着工統計調査(H27年：鹿児島県)）

(3) 大規模改修の単価設定

構造	単価 (円/㎡)
鉄筋コンクリート造	110,000
鉄骨鉄筋コンクリート造	150,000
鉄骨造	39,000
軽量鉄骨造	-
コンクリートブロック造	38,000
木造	-

※単価については、総合管理計画作成時に使用した単価を採用（建築着工統計調査(H27年：鹿児島県)）

(4) 解体費用

構造	単価 (円/㎡)
鉄筋コンクリート造	52,000
鉄骨鉄筋コンクリート造	71,000
鉄骨造	33,000
軽量鉄骨造	29,000
コンクリートブロック造	32,000
木造	41,000

※単価については、総合管理計画作成時に使用した単価を採用（建築着工統計調査(H27年：鹿児島県)）

(5) 部位修繕費用

部位	建替え費用に対する割合
屋根・屋上	3.5%
外壁	5.1%
内部仕上げ	5.6%
電気設備	4.0%
機械設備	3.7%

※「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属エクセルソフト」（文部科学省）でのコスト算出条件

直近の類似施設の工事实績が得られる場合には、実態に即した単価を設定することが望ましいことから、新築や改修を行う際には価格、単価等についての詳細な情報を管理し、正確な予測が行えるよう努めます。

第3節 実施時期設定と費用試算

保全優先度判定による対策内容の検討と市の政策を考慮し、今後10年間の対策事業と時期を設定し、必要となる費用を試算しました。

対策の実施時期については、本市の過去5年間の公共建築物の更新（改修）工事に充てた平均費用をもとに、財政制約ラインを約5.1億円と設定し、年度ごとのバラツキが生じないよう対策の実施時期を調整しています。なお、新規工事を予定している事業年度についてはその限りではありません。

過去5年間の普通建設事業費は以下のとおりです。

（単位：千円）

年度	普通建設事業費					合計
	公共建築物		インフラ施設	人件費	その他	
	新規	更新(改修)				
平成 27 年度	984,053	539,230	996,088	179,391	813,248	3,512,010
平成 28 年度	455,577	489,508	928,095	157,406	900,431	2,931,017
平成 29 年度	2,330,694	450,028	908,153	164,772	1,162,908	5,016,555
平成 30 年度	0	238,263	878,844	124,315	478,234	1,719,656
令和元年度	0	841,665	786,164	158,091	603,745	2,389,665
合計	3,770,324	2,558,694	4,497,344	783,975	3,958,566	15,568,903
H27～R1 平均	754,065	511,739	899,469	156,795	791,713	3,113,781

※公共建築物のうち過去5年間の主な工事

新規工事：伊佐市衛生センター（きらり館）、カヌー艇庫新築、消防詰所、菱刈小学校など

更新（改修）工事：公営住宅長寿命化、大口中央中学校改修、市内小中学校空調整備など

本計画の費用試算は、建物構造から標準的な統一単価を用いて算定していることから、計画するうえでの目安であり、実際に対策を実施する前には、対象施設の詳細調査を行い、劣化状態や本計画の費用試算、財政状況などから対策工法について検討し、実施設計及び工事を実施することとします。

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 1

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
1	1	伊佐市役所大口庁舎	庁舎_本館	1 行政系施設	2,019.30	鉄筋コンクリート造	1956	50	64	C	C	C	C	C	40	B	I	建替え (R4~5) 解体 (R7)	4,105,004		2,000,000	2,000,000		105,004					
1	1	伊佐市役所大口庁舎	庁舎_別館	1 行政系施設	1,896.30	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	B	C	C	C	C	43	B	I	解体	98,608					98,608					
1	1	伊佐市役所大口庁舎	車庫・駐車場	1 行政系施設	160.00	鉄骨造	1977	38	43	C	C	C	C	C	40	B	I	解体	5,280					5,280					
2	6	伊佐市役所菱刈庁舎	庁舎	1 行政系施設	2,954.80	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	D	I	部位修繕 (R3) 大規模改修 (R5)	329,028	4,000		325,028							
2	6	伊佐市役所菱刈庁舎	公用車車庫 (庁舎北側 2)	1 行政系施設	119.07	鉄骨造	1982	38	38	A	A	B	B	B	84	D	I	簡易補修	0										
2	6	伊佐市役所菱刈庁舎	庁舎倉庫 (庁舎東側 2)	1 行政系施設	103.50	木造	1989	24	31	A	A	B	B	B	84	D	I	簡易補修	0										
3	48	防災用具倉庫 (旧スクールバス車庫)	車庫・駐車場	1 行政系施設	72.00	軽量鉄骨造	1973	26	47	C	C	C	C	C	40	C	II	簡易補修	0										
4	152	上町班消防詰所	詰所	1 行政系施設	144.74	鉄骨造	1991	38	29	A	A	B	B	B	84	E	II	簡易補修	0										
5	153	里町班消防詰所	詰所	1 行政系施設	125.42	鉄骨造	1986	38	34	A	B	B	B	B	77	E	II	簡易補修	0										
6	154	第 9 分団消防詰所	詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2012	38	8	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
7	155	第 1 0 分団消防詰所	詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2012	38	8	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
8	156	第 3 分団消防詰所	詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2013	38	7	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
9	157	第 8 分団消防詰所	詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2013	38	7	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
10	158	宮人書庫	倉庫	1 行政系施設	297.00	鉄骨造	1969	38	51	D	C	D	D	D	19	C	III	解体	9,801								9,801		
11	163	第 4 分団消防詰所	詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2015	38	5	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
12	164	第 7 分団消防詰所	詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2015	38	5	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
13	166	第 2 分団消防詰所	2 分団消防詰所	1 行政系施設	132.00	鉄骨造	2017	38	3	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
14	20	菱刈ふるさといきがいセンター	図書館	2 社会教育系施設	847.00	鉄筋コンクリート造	1993	50	27	B	C	B	B	B	65	E	II	大規模改修	120,788				72,489	48,299					
14	20	菱刈ふるさといきがいセンター	生涯学習	2 社会教育系施設	236.00	鉄筋コンクリート造	1993	50	27	B	C	B	B	B	65	E	II	大規模改修	32,756				19,658	13,098					
14	20	菱刈ふるさといきがいセンター	資料館	2 社会教育系施設	366.00	鉄筋コンクリート造	1993	50	27	B	C	B	B	B	65	E	II	大規模改修	51,182				30,716	20,466					
15	22	ふれあいセンター	集会所	2 社会教育系施設	3,485.00	鉄骨鉄筋コンクリート造	1991	50	29	B	C	B	B	B	65	D	I	大規模改修	522,750		522,750								
15	22	ふれあいセンター	資料館	2 社会教育系施設	992.00	鉄骨鉄筋コンクリート造	1991	50	29	B	C	B	B	B	65	D	I	大規模改修	148,800			148,800							
15	22	ふれあいセンター	図書館	2 社会教育系施設	1,080.00	鉄骨鉄筋コンクリート造	1991	50	29	B	C	B	B	B	65	D	I	大規模改修	162,000			162,000							
15	22	ふれあいセンター	事務所	2 社会教育系施設	208.00	鉄骨鉄筋コンクリート造	1991	50	29	B	C	B	B	B	65	D	I	大規模改修	31,200			31,200							
15	22	ふれあいセンター	店舗	2 社会教育系施設	147.00	鉄骨鉄筋コンクリート造	1991	50	29	B	C	B	B	B	65	D	I	大規模改修	22,050			22,050							
16	15	伊佐市大口元気こころ館	多目的福祉施設	3 保健・福祉施設	1,269.54	鉄骨造	2002	38	18	B	B	B	B	B	75	E	II	大規模改修	49,512				49,512						
17	17	伊佐市菱刈総合保健福祉センター	歩行浴場	3 保健・福祉施設	422.00	鉄筋コンクリート造	2002	50	18	B	B	A	C	C	75	E	II	簡易補修	0	建設中									

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－2

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
17	17	伊佐市菱刈総合保健福祉センター	多目的保健施設	3 保健・福祉施設	776.70	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	A	B	A	A	A	93	E	Ⅱ	大規模改修	85,437								85,437		
17	17	伊佐市菱刈総合保健福祉センター	多目的福祉施設	3 保健・福祉施設	1,799.66	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	A	B	A	A	A	93	E	Ⅱ	簡易補修	0										
18	159	保健関係保管庫	多目的保健施設	3 保健・福祉施設	687.80	鉄筋コンクリート造	1975	50	45	D	D	D	D	D	10	B	Ⅱ	解体	35,766								35,766		
19	21	ひまわり館	集会所	4 市民文化系施設	159.26	木造	2003	24	17	A	C	A	A	A	83	E	Ⅱ	部位修繕	2,750								2,750		
20	23	羽月西青少年センター	集会所	4 市民文化系施設	141.88	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	C	C	C	C	C	40	C	Ⅱ	部位修繕	10,036								10,036		
21	24	羽月地区公民館	集会所	4 市民文化系施設	353.05	コンクリートブロック造	1973	41	47	D	D	D	D	D	10	B	Ⅱ	部位修繕	14,690				14,690						
22	26	牛尾青少年センター	集会所	4 市民文化系施設	119.24	木造	1977	24	43	B	B	B	C	C	66	E	Ⅱ	部位修繕	1,863										1,863
23	27	共進地区教育集会施設	集会所	4 市民文化系施設	132.49	木造	1976	24	44	B	B	C	C	C	53	D	Ⅱ	部位修繕	3,577								3,577		
24	28	元町青少年会館	集会所	4 市民文化系施設	125.87	木造	1982	24	38	B	B	C	B	B	62	E	Ⅱ	簡易補修	0										
25	29	山野西文化交流館	校舎・園舎	4 市民文化系施設	432.00	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	C	C	C	C	C	40	C	Ⅱ	簡易補修	0										
25	29	山野西文化交流館	体育館	4 市民文化系施設	210.00	鉄骨造	1981	38	39	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	簡易補修	0										
26	30	小木原東集会所	集会所	4 市民文化系施設	132.39	木造	1985	24	35	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
27	31	松木原集会所	集会所	4 市民文化系施設	132.21	木造	1993	24	27	B	A	B	B	B	82	E	Ⅱ	簡易補修	0										
28	32	神池集会所	集会所	4 市民文化系施設	132.30	木造	1987	24	33	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
29	33	針持青少年センター	集会所	4 市民文化系施設	119.24	木造	1978	24	42	B	C	B	C	C	56	D	Ⅱ	部位修繕	3,098										3,098
30	34	西永尾集会所	集会所	4 市民文化系施設	132.39	木造	1981	24	39	B	B	C	B	B	62	E	Ⅱ	簡易補修	0										
31	35	青木元教育集会施設	集会所	4 市民文化系施設	151.76	木造	1984	24	36	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
32	36	曾木青少年自立自興会館	集会所	4 市民文化系施設	125.87	木造	1985	24	35	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
33	37	大口東青少年センター	集会所	4 市民文化系施設	119.24	木造	1979	24	41	B	B	B	C	C	66	E	Ⅱ	部位修繕	1,863										1,863
34	38	田中校区集会施設	集会所	4 市民文化系施設	821.64	鉄筋コンクリート造	1998	50	22	B	C	B	B	B	65	E	Ⅱ	部位修繕	38,534								38,534		
35	39	湯之尾校区集会施設	集会所	4 市民文化系施設	840.00	鉄筋コンクリート造	1986	50	34	B	B	B	C	B	70	E	Ⅱ	部位修繕	15,000		15,000								
36	40	平出水青少年センター	集会所	4 市民文化系施設	119.24	木造	1979	24	41	B	B	B	C	C	66	E	Ⅱ	部位修繕	1,863										1,863
37	41	本城校区公民館	集会所	4 市民文化系施設	398.00	木造	1992	24	28	C	B	B	B	B	72	E	Ⅱ	部位修繕	31,000	18,500								12,500	
38	43	文化会館	文化会館	4 市民文化系施設	4,158.13	鉄骨鉄筋コンクリート造	1981	50	39	B	B	C	C	C	53	C	Ⅰ	部位修繕(R3)大規模改修(R8～9)	746,361	1,205					372,578	372,578			
39	44-2	菱刈環境改善センター	市民センター	4 市民文化系施設	1,354.97	鉄筋コンクリート造	1988	50	32	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕(R3～4)大規模改修(R11)	186,211	1,800	18,000							166,411	
39	44-2	菱刈環境改善センター	野外ステージ	4 市民文化系施設	286.85	鉄筋コンクリート造	1991	50	29	C	C	B	B	B	62	D	Ⅰ	部位修繕(R3)大規模改修(R11)	35,314		2,900							32,414	
40	143	布計地区多目的集会施設	集会所	4 市民文化系施設	195.00	木造	1996	24	24	A	A	B	B	D	76	E	Ⅱ	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 3

個別計画 画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	部位別劣化度					健全 全度	保全 優先 度	重要 度	対策内容	計画期間内 の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外 壁	内 部	電 気	機 械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
41	147	西太良コミュニティセ ンター	集会所	4 市民文化系施設	289.57	鉄筋コンクリート造	1973	50	47	A	B	C	C	C	55	D	Ⅱ	部位修繕	12,055							12,055			
42	148	山野基幹集落センター	山野基幹集落センター	4 市民文化系施設	364.90	鉄筋コンクリート造	1975	50	45	B	B	C	C	C	53	D	Ⅱ	部位修繕	10,837	10,837									
43	149	大口富士福祉館	福祉館	4 市民文化系施設	132.30	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	A	A	B	C	C	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
44	150	菱刈人権文化センター	市民センター	4 市民文化系施設	198.00	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
45	49	大口小学校	校舎 1	5 学校教育系施設	1,058.00	鉄筋コンクリート造	1972	50	48	B	C	C	C	B	47	B	Ⅰ	部位修繕	16,889								16,889		
45	49	大口小学校	校舎 2	5 学校教育系施設	539.00	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	B	C	C	C	B	47	B	Ⅰ	部位修繕	8,604								8,604		
45	49	大口小学校	校舎 3	5 学校教育系施設	1,331.00	鉄筋コンクリート造	1974	50	46	A	B	C	C	C	55	C	Ⅰ	簡易補修	0										
45	49	大口小学校	校舎 4	5 学校教育系施設	583.00	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	A	A	C	C	B	67	D	Ⅰ	簡易補修	0										
45	49	大口小学校	校舎 5	5 学校教育系施設	602.00	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	A	A	C	C	B	67	D	Ⅰ	簡易補修	0										
45	49	大口小学校	体育館	5 学校教育系施設	1,075.00	鉄筋コンクリート造	2000	50	20	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
46	50	大口東小学校	校舎・園舎_管理教室 棟	5 学校教育系施設	1,161.00	鉄筋コンクリート造	1962	50	58	A	A	C	C	C	62	D	Ⅰ	簡易補修	0										
46	50	大口東小学校	校舎・園舎_特別教室 棟	5 学校教育系施設	494.00	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	A	A	C	C	C	62	D	Ⅰ	簡易補修	0										
46	50	大口東小学校	体育館	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1983	38	37	A	A	C	C	C	62	D	Ⅰ	簡易補修	0										
47	51	牛尾小学校	校舎・園舎 1	5 学校教育系施設	1,175.00	鉄筋コンクリート造	1963	50	57	A	D	D	C	D	22	A	Ⅰ	部位修繕	18,757				18,757						
47	51	牛尾小学校	校舎・園舎 2	5 学校教育系施設	399.00	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	A	D	D	C	D	22	A	Ⅰ	部位修繕	6,369				6,369						
47	51	牛尾小学校	音楽室	5 学校教育系施設	210.00	木造	2001	24	19	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
47	51	牛尾小学校	体育館	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1981	38	39	C	A	C	B	B	67	D	Ⅰ	部位修繕	2,600		2,600								
48	52	山野小学校	校舎 1	5 学校教育系施設	1,234.00	鉄筋コンクリート造	1967	50	53	C	D	D	C	D	17	A	Ⅰ	部位修繕	57,000	57,000									
48	52	山野小学校	校舎 2	5 学校教育系施設	396.00	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	C	D	C	C	C	31	A	Ⅰ	部位修繕	10,660					10,660					
48	52	山野小学校	校舎 3	5 学校教育系施設	338.00	鉄筋コンクリート造	1984	50	36	C	C	B	B	B	62	D	Ⅰ	部位修繕	9,098					9,098					
48	52	山野小学校	体育館	5 学校教育系施設	798.00	鉄筋コンクリート造	1992	50	28	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	21,481								21,481		
49	53	平出水小学校	校舎・園舎	5 学校教育系施設	1,080.00	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	B	C	C	C	C	43	B	Ⅰ	部位修繕	29,071						29,071				
49	53	平出水小学校	体育館	5 学校教育系施設	710.00	鉄筋コンクリート造	1988	50	32	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	19,112						19,112				
50	54	羽月小学校	校舎 1	5 学校教育系施設	2,209.00	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	A	A	C	C	C	62	D	Ⅰ	簡易補修	0										
50	54	羽月小学校	校舎 3	5 学校教育系施設	168.00	木造	1986	24	34	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	簡易補修	0										
50	54	羽月小学校	体育館	5 学校教育系施設	919.00	鉄筋コンクリート造	1991	50	29	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	24,738								24,738		
51	56	羽月西小学校	体育館	5 学校教育系施設	521.00	鉄骨造	1978	38	42	B	B	C	C	C	53	C	Ⅰ	部位修繕	8,782				8,782						

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 4

個別計画 画 NO	総合管理 計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	部位別劣化度					健全 度	保 全 優 先 度	重 要 度	対策内容	計画期間内 の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋 根	外 壁	内 部	電 気	機 械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	
51	56	羽月西小学校	校舎・園舎 1	5 学校教育系施設	1,472.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1979	50	41	A	A	B	B	B	84	D	I	簡易補修	0										
51	56	羽月西小学校	校舎・園舎 2	5 学校教育系施設	170.00	鉄骨造	2001	38	19	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
52	57	曾木小学校	体育館	5 学校教育系施設	710.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1986	50	34	B	B	B	B	B	75	D	I	部位修繕	19,112									19,112	
52	57	曾木小学校	校舎・園舎	5 学校教育系施設	1,804.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1990	50	30	C	B	B	B	B	72	D	I	部位修繕	53,797	25,000								28,797	
53	58	針持小学校	校舎(旧幼稚園)	5 学校教育系施設	834.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1975	50	45	A	A	C	C	C	62	D	I	簡易補修	0										
53	58	針持小学校	校舎	5 学校教育系施設	791.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1975	50	45	A	A	C	C	C	62	D	I	簡易補修	0										
53	58	針持小学校	体育館	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1982	38	38	A	B	C	B	C	59	C	I	簡易補修	0										
54	59	湯之尾小学校	校舎・園舎	5 学校教育系施設	1,419.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1992	50	28	B	A	B	B	B	82	D	I	部位修繕	38,197								38,197		
54	59	湯之尾小学校	体育館	5 学校教育系施設	889.29	鉄骨造	1988	38	32	C	B	B	B	B	72	D	I	部位修繕	14,990					14,990					
54	59	湯之尾小学校	管理小屋・管理棟	5 学校教育系施設	314.25	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	B	B	B	B	B	75	D	I	部位修繕	8,459								8,459		
54	59	湯之尾小学校	給食室・調理室	5 学校教育系施設	167.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	B	A	B	B	B	82	D	I	簡易補修	0										
55	60	菱刈小学校	校舎 1	5 学校教育系施設	1,462.60	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1989	50	31	B	B	B	B	B	75	D	I	部位修繕	39,370							39,370			
55	60	菱刈小学校	給食室・調理室	5 学校教育系施設	218.28	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1991	50	29	B	B	B	B	B	75	D	I	簡易補修	0										
55	60	菱刈小学校	体育館	5 学校教育系施設	680.00	鉄骨造	1984	38	36	C	C	B	B	B	62	D	I	部位修繕	1,400	1,400									
55	60	菱刈小学校	菱刈小学校新校舎（木造）	5 学校教育系施設	1,443.00	木造	2015	24	5	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
56	61	南永小学校	校舎・園舎	5 学校教育系施設	676.00	木造	2002	24	18	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
56	61	南永小学校	体育館	5 学校教育系施設	504.00	木造	2002	24	18	A	B	A	A	A	93	D	I	簡易補修	0										
57	62	本城小学校	教室棟	5 学校教育系施設	1,319.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1964	50	56	A	C	C	D	D	37	A	I	部位修繕	35,505		35,505								
57	62	本城小学校	特別教室・管理棟	5 学校教育系施設	880.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1986	50	34	C	B	B	B	B	72	D	I	部位修繕	23,688									23,688	
57	62	本城小学校	体育館	5 学校教育系施設	700.00	鉄骨造	1987	38	33	C	B	B	B	B	72	D	I	簡易補修	0										
57	62	本城小学校	給食室・調理室	5 学校教育系施設	216.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1994	50	26	B	B	B	B	B	75	D	I	簡易補修	0										
58	63	田中小学校	給食室・調理室	5 学校教育系施設	267.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1990	50	30	B	B	B	B	B	75	D	I	簡易補修	0										
58	63	田中小学校	校舎	5 学校教育系施設	1,103.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1970	50	50	A	A	D	C	C	51	C	I	部位修繕	19,333					19,333					
58	63	田中小学校	校舎増築分	5 学校教育系施設	292.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1985	50	35	A	A	C	C	C	62	D	I	簡易補修	0										
58	63	田中小学校	体育館	5 学校教育系施設	698.00	鉄骨造	1986	38	34	C	B	C	B	B	59	C	I	部位修繕	11,765				11,765						
59	64	大口中央中学校	更衣室・脱衣所・部室	5 学校教育系施設	116.00	木造	1999	24	21	B	B	B	B	B	75	D	I	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 5

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
59	64	大口中央中学校	校舎南棟	5 学校教育系施設	1,950.00	鉄筋コンクリート造	2003	50	17	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
59	64	大口中央中学校	校舎北棟	5 学校教育系施設	1,949.00	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
59	64	大口中央中学校	校舎中央棟	5 学校教育系施設	515.00	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
59	64	大口中央中学校	格技場	5 学校教育系施設	446.00	鉄骨造	1979	38	41	D	D	D	C	C	17	A	I	建替え	87,416									87,416	
59	64	大口中央中学校	体育館	5 学校教育系施設	986.00	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	C	B	B	B	B	72	D	I	部位修繕	10,802					10,802					
59	64	大口中央中学校	校舎（その他）	5 学校教育系施設	135.00	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	C	B	B	B	B	72	D	I	部位修繕	1,479					1,479					
59	64	大口中央中学校	特別教室棟	5 学校教育系施設	429.00	鉄筋コンクリート造	1987	50	33	C	B	B	B	B	72	D	I	簡易補修	0										
59	64	大口中央中学校	校舎東棟	5 学校教育系施設	1,061.00	鉄筋コンクリート造	2014	50	6	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
59	64	大口中央中学校	校舎	5 学校教育系施設	997.00	鉄筋コンクリート造	2014	50	6	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	更衣室・脱衣所・部室	5 学校教育系施設	350.00	鉄筋コンクリート造	1990	50	30	B	B	B	B	B	75	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	格技場	5 学校教育系施設	580.00	鉄骨造	1991	38	29	B	A	B	B	B	82	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	普通教室棟	5 学校教育系施設	3,145.00	鉄筋コンクリート造	1968	50	52	A	B	A	A	A	93	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	特別教室棟	5 学校教育系施設	1,673.00	鉄筋コンクリート造	1969	50	51	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	給食室・調理室	5 学校教育系施設	124.00	鉄骨造	1968	38	52	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	倉庫 1	5 学校教育系施設	196.00	鉄筋コンクリート造	1968	50	52	C	C	B	B	B	62	D	I	簡易補修	0										
60	65	菱刈中学校	体育館	5 学校教育系施設	1,092.00	鉄筋コンクリート造	1970	50	50	A	B	C	B	C	60	D	I	簡易補修	0										
61	162	伊佐市立学校給食センター（新）	給食センター	5 学校教育系施設	1,594.50	鉄骨造	2010	38	10	A	A	A	A	A	100	D	I	大規模改修	62,186										62,186
61	162	伊佐市立学校給食センター（新）	車庫・駐車場	5 学校教育系施設	130.00	鉄骨造	2010	38	10	A	A	A	A	A	100	D	I	大規模改修	5,070										5,070
62	68	総合交流拠点施設	校舎 1	6 子育て支援施設	1,647.00	鉄筋コンクリート造	1970	50	50	C	C	C	C	C	40	C	II	簡易補修	0										
62	68	総合交流拠点施設	校舎 2	6 子育て支援施設	2,169.00	鉄筋コンクリート造	1971	50	49	C	C	C	C	C	40	C	II	簡易補修	0										
62	68	総合交流拠点施設	格技場	6 子育て支援施設	305.00	鉄骨造	1977	38	43	C	C	C	C	C	40	C	II	簡易補修	0										
62	68	総合交流拠点施設	体育館	6 子育て支援施設	1,000.00	鉄筋コンクリート造	1972	50	48	C	C	C	C	C	40	C	II	簡易補修	0										
63	69	本城幼稚園	幼稚園	6 子育て支援施設	252.00	木造	1997	24	23	A	C	A	A	A	83	D	I	部位修繕	2,800			2,800							
64	160	子ども交流支援センター	療育・相談施設 1	6 子育て支援施設	420.66	木造	2010	24	10	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
64	160	子ども交流支援センター	療育・相談施設 2	6 子育て支援施設	107.64	軽量鉄骨造	2010	26	10	A	A	A	A	A	100	D	I	簡易補修	0										
65	161	トータルサポートセンター	療育・相談施設	6 子育て支援施設	160.00	木造	2011	24	9	A	A	A	A	A	100	F	III	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 6

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
66	81-2	山野西住宅	教職員住宅 2	7 公営住宅	81.10	木造	2000	24	20	A	A	A	A	A	100	F	Ⅲ	簡易補修	0										
67	86-1	羽月北住宅(旧羽月北小教職員住宅)	羽月北住宅 1 号	7 公営住宅	62.53	木造	1985	24	35	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	解体	2,564										2,564
67	86-1	羽月北住宅(旧羽月北小教職員住宅)	羽月北住宅 2 号	7 公営住宅	62.53	木造	1986	24	34	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	解体	2,564										2,564
68	106	元町団地	1 号棟 (4 F)	7 公営住宅	1,122.11	鉄筋コンクリート造	1984	50	36	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	長寿命化改修	20,400					20,400					
68	106	元町団地	2 号棟 (4 F)	7 公営住宅	1,122.11	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	長寿命化改修	27,200					27,200					
69	107	下殿団地	1 7 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートブロック造	1969	41	51	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
70	108	大田団地	市営住宅	7 公営住宅	208.56	コンクリートブロック造	1955	41	65	C	C	D	D	D	21	C	Ⅲ	簡易補修	0	※公営住宅については、公営住宅長寿命化計画書から対策内容・費用等を反映しています。									
71	109	水ノ手団地	市営住宅	7 公営住宅	208.56	コンクリートブロック造	1955	41	65	C	C	D	D	D	21	C	Ⅲ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	1 号棟	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	2 号棟	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	3 号棟	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	4 号棟	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	5 号棟	7 公営住宅	124.65	鉄筋コンクリート造	2016	50	4	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	6 号棟	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	7 号棟	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	8 号棟	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	9 号棟	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
72	110	小水流団地	10 号棟	7 公営住宅	124.65	木造	2017	24	3	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
73	112	高校西団地	集会所	7 公営住宅	127.24	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
73	112	高校西団地	3 号棟	7 公営住宅	2,464.56	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
73	112	高校西団地	4 号棟	7 公営住宅	1,583.89	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
73	112	高校西団地	渡り廊下	7 公営住宅	169.61	鉄筋コンクリート造	2004	50	16	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
74	113	下之馬場団地	1 号棟	7 公営住宅	385.14	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
74	113	下之馬場団地	2 号棟	7 公営住宅	320.95	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
74	113	下之馬場団地	3 号棟	7 公営住宅	254.24	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
74	113	下之馬場団地	4 号棟	7 公営住宅	190.68	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
74	113	下之馬場団地	5 号棟	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
74	113	下之馬場団地	6 号棟	7 公営住宅	190.68	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
75	114	曾木団地	市営住宅	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 7

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
76	115	針持団地	市営住宅	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
77	116	岐山団地	市営住宅	7 公営住宅	381.36	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 号棟 2 F	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 号棟 2 F	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	3 号棟 2 F	7 公営住宅	215.40	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	4 号棟 2 F	7 公営住宅	167.52	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	5 号棟 2 F	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0	※公営住宅については、公営住宅長寿命化計画書から対策内容・費用等を反映しています。									
78	117	郡山団地	6 号棟 2 F	7 公営住宅	215.40	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	7 号棟 2 F	7 公営住宅	231.28	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	8 号棟 2 F	7 公営住宅	215.40	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	9 号棟 2 F	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 0 号棟 2 F	7 公営住宅	223.36	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 1 号棟 2 F	7 公営住宅	173.46	鉄筋コンクリート造	1978	50	42	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 2 号棟 2 F	7 公営住宅	167.52	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 3 号棟 2 F	7 公営住宅	167.52	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 4 号棟 2 F	7 公営住宅	111.68	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 5 号棟 2 F	7 公営住宅	223.36	鉄筋コンクリート造	1977	50	43	D	D	C	C	C	29	B	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 6 号棟 2 F	7 公営住宅	186.60	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 7 号棟 2 F	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 8 号棟 2 F	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	1 9 号棟 2 F	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 0 号棟 2 F	7 公営住宅	254.24	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 1 号棟 2 F	7 公営住宅	317.80	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 2 号棟 2 F	7 公営住宅	256.76	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 3 号棟 2 F	7 公営住宅	256.76	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 4 号棟 2 F	7 公営住宅	248.80	鉄筋コンクリート造	1980	50	40	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 5 号棟 2 F	7 公営住宅	254.24	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 6 号棟 2 F	7 公営住宅	317.80	鉄筋コンクリート造	1982	50	38	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
78	117	郡山団地	2 7 号棟 2 F	7 公営住宅	192.57	鉄筋コンクリート造	1981	50	39	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
79	118	平出水団地	1 号棟	7 公営住宅	135.80	木造	1992	24	28	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
79	118	平出水団地	2 号棟	7 公営住宅	129.18	木造	1992	24	28	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 8

個別計画 画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	部位別劣化度					健全 度	保 全 優 先 度	重 要 度	対策内容	計画期間内 の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外 壁	内 部	電 気	機 械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
79	118	平出水団地	3 号棟	7 公営住宅	135.80	木造	1992	24	28	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
79	118	平出水団地	4 号棟	7 公営住宅	149.42	木造	2000	24	20	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
79	118	平出水団地	5 号棟	7 公営住宅	149.42	木造	2000	24	20	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
80	119	前目第 1 団地	市営住宅 1	7 公営住宅	277.34	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1977	50	43	C	C	C	C	C	40	C	Ⅱ	簡易補修	0										
80	119	前目第 1 団地	市営住宅 2	7 公営住宅	277.34	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1977	50	43	C	C	C	C	C	40	C	Ⅱ	簡易補修	0										
81	120	前目第 2 団地	市営住宅	7 公営住宅	137.39	木造	1992	24	28	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
81	120	前目第 2 団地	前目第 2 住宅（2 5－3・4）	7 公営住宅	156.68	木造	2000	24	20	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0	※公営住宅については、公営住宅長寿命化計画書から対策内容・費用等を反映しています。									
81	120	前目第 2 団地	前目第 2 住宅（2 5－5・6）	7 公営住宅	156.68	木造	2000	24	20	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
81	120	前目第 2 団地	前目第 2 住宅（2 5－7・8）	7 公営住宅	156.68	木造	2000	24	20	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
82	121	池田団地	市営住宅 1	7 公営住宅	233.56	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1978	50	42	C	D	C	C	C	31	B	Ⅱ	簡易補修	0										
82	121	池田団地	市営住宅 2	7 公営住宅	233.56	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1978	50	42	C	D	C	C	C	31	B	Ⅱ	簡易補修	0										
82	121	池田団地	市営住宅 3	7 公営住宅	116.78	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1978	50	42	C	D	C	C	C	31	B	Ⅱ	簡易補修	0										
83	122	瓜ノ峰第 1 団地	市営住宅 1	7 公営住宅	298.55	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1979	50	41	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	簡易補修	0										
83	122	瓜ノ峰第 1 団地	市営住宅 2	7 公営住宅	298.55	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1979	50	41	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	簡易補修	0										
84	123	湯之尾団地	市営住宅	7 公営住宅	815.31	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1980	50	40	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	長寿命化改修	20,400			20,400							
85	124	中央団地	市営住宅	7 公営住宅	841.58	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1990	50	30	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	長寿命化改修	20,400							20,400			
86	125	重留西第 1 団地	市営住宅	7 公営住宅	1,158.80	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1985	50	35	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	長寿命化改修	27,200							27,200			
87	126	重留西第 2 団地	市営住宅	7 公営住宅	1,201.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1992	50	28	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
88	127	前目麓団地	市営住宅	7 公営住宅	1,247.40	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1993	50	27	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	簡易補修	0										
89	128	瓜ノ峰第 2 団地	市営住宅	7 公営住宅	901.48	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1994	50	26	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	長寿命化改修	31,500	31,500									
90	129	北俣団地	市営住宅	7 公営住宅	1,005.42	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1997	50	23	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	長寿命化改修	20,400		20,400								
91	130	中水流住宅	単独住宅	7 公営住宅	119.30	木造	2002	24	18	C	C	C	C	C	40	D	Ⅲ	解体	4,891										4,891
92	131	大口里住宅	単独住宅	7 公営住宅	103.80	木造	1964	24	56	B	B	C	C	D	49	D	Ⅲ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	A 棟	7 公営住宅	353.74	木造	1999	24	21	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	B 棟	7 公営住宅	353.74	木造	1999	24	21	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	C 棟	7 公営住宅	353.74	木造	1999	24	21	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	D 棟	7 公営住宅	353.74	木造	1998	24	22	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	E 棟	7 公営住宅	353.74	木造	1998	24	22	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	F 棟	7 公営住宅	287.18	木造	1999	24	21	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
93	132	こっがら団地	G 棟	7 公営住宅	287.18	木造	1998	24	22	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－ 9

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
94	133	ウッドタウン菱刈	ウッドタウン菱刈 1 号棟	7 公営住宅	172.50	木造	1999	24	21	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
94	133	ウッドタウン菱刈	ウッドタウン菱刈 2 号棟	7 公営住宅	164.02	木造	1999	24	21	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
94	133	ウッドタウン菱刈	ウッドタウン菱刈 4 号棟	7 公営住宅	164.02	木造	1999	24	21	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
94	133	ウッドタウン菱刈	ウッドタウン菱刈 9 号棟	7 公営住宅	164.02	木造	1999	24	21	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (10-1, -2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	155.64	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (9-1, -2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (10-1, -2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	155.64	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (9-1, -2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (8-1, -2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0	※公営住宅については、公営住宅長寿命化計画書から対策内容・費用等を反映しています。									
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (7-1, -2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (6-1, 6-2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (5-1, 5-2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (4-1, 4-2)	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (3-1, 3-2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (2-1, 2-2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
95	134	山田団地	改良住宅前田住宅 (1-1, 1-2) 1 棟 2 戸	7 公営住宅	153.42	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	4 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1968	41	52	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	5 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1968	41	52	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	6 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1968	41	52	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	7 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1967	41	53	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	8 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1967	41	53	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 0 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1967	41	53	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 1 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1967	41	53	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 2 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 5 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 6 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 7 号棟	7 公営住宅	150.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 3 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 4 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	1 8 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－10

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
96	111-1	西水流団地 1	1 9 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートブロック造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
96	111-1	西水流団地 1	2 0 号棟	7 公営住宅	132.00	コンクリートブロック造	1966	41	54	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	簡易補修	0										
97	111-2	西水流団地 2	2 1 号棟 4 F	7 公営住宅	1,630.59	鉄筋コンクリート造	1979	50	41	A	A	C	C	C	62	E	Ⅱ	長寿命化改修	40,800				40,800						
98	71	下殿南住宅	教職員住宅	7 公営住宅	69.94	木造	1981	24	39	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
99	8	十曽青少年旅行村	集会所	8 スポーツ・レクリエーション系施設	301.00	木造	1997	24	23	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
100	10	旧布計小学校	旧布計小学校	8 スポーツ・レクリエーション系施設	496.58	木造	1940	24	80	A	A	B	B	B	84	F	Ⅲ	簡易補修	0										
101	12	楠本川溪流自然公園	管理小屋・管理棟	8 スポーツ・レクリエーション系施設	181.67	木造	1993	24	27	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
102	16	大口温泉高熊荘	浴場	8 スポーツ・レクリエーション系施設	343.11	鉄筋コンクリート造	1986	50	34	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
103	42	総合運動公園	総合体育館	8 スポーツ・レクリエーション系施設	3,320.87	鉄筋コンクリート造	1973	50	47	A	B	D	C	D	40	B	Ⅰ	部位修繕	100,000		100,000								
103	42	総合運動公園	メインスタンド	8 スポーツ・レクリエーション系施設	680.08	鉄筋コンクリート造	1969	50	51	D	C	C	C	D	34	A	Ⅰ	部位修繕	48,106					48,106					
103	42	総合運動公園	弓道場	8 スポーツ・レクリエーション系施設	393.66	木造	1986	24	34	A	B	B	B	B	77	D	Ⅰ	簡易補修	0										
103	42	総合運動公園	野球場メインスタンド・観覧席	8 スポーツ・レクリエーション系施設	140.00	鉄筋コンクリート造	1974	50	46	D	D	D	C	D	14	A	Ⅰ	大規模改修	15,820			15,820							
103	42	総合運動公園	屋外プール	8 スポーツ・レクリエーション系施設	173.50	鉄筋コンクリート造	1976	50	44	D	D	D	D	D	10	A	Ⅰ	大規模改修	19,605						19,605				
103	42	総合運動公園	体育センター	8 スポーツ・レクリエーション系施設	978.00	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	B	C	C	B	B	52	C	Ⅰ	大規模改修	127,140				127,140						
104	44-1	農村公園	トレーニングセンター	8 スポーツ・レクリエーション系施設	1,655.07	鉄筋コンクリート造	1985	50	35	B	B	B	B	C	71	D	Ⅰ	大規模改修	187,022								187,022		
104	44-1	農村公園	競技場・スタンド	8 スポーツ・レクリエーション系施設	235.73	木造	1990	24	30	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	50,000				25,000	25,000					
105	45	カヌー艇庫	船庫・船小屋	8 スポーツ・レクリエーション系施設	199.12	鉄骨造	2009	38	11	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
105	45	カヌー艇庫	艇庫	8 スポーツ・レクリエーション系施設	384.27	鉄骨造	2017	38	3	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
105	45	カヌー艇庫	事務所	8 スポーツ・レクリエーション系施設	575.57	鉄骨造	2017	38	3	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
106	46	湯之尾体育広場カヌー艇庫	船庫・船小屋	8 スポーツ・レクリエーション系施設	111.07	鉄骨造	1989	38	31	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
107	47	湯之尾屋内ゲートボール場	競技場・スタンド	8 スポーツ・レクリエーション系施設	1,510.00	鉄骨造	1987	38	33	C	B	B	B	B	72	E	Ⅱ	部位修繕	17,400										17,400
108	67	山野地区体育館	体育館	8 スポーツ・レクリエーション系施設	727.00	鉄骨造	1980	38	40	C	D	D	C	D	17	C	Ⅲ	解体	23,264									23,264	
109	7	轟公園	一般事務所	9 公園	171.83	鉄筋コンクリート造	1997	50	23	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
110	13	曾木の滝公園	案内施設	9 公園	123.83	木造	2011	24	9	A	C	A	A	A	83	F	Ⅲ	部位修繕	1,953		1,953								
111	9	伊佐市夢さくら館敷地	店舗	10 産業系施設	423.18	木造	1998	24	22	C	B	B	B	B	72	F	Ⅲ	簡易補修	0										
112	11	伊佐市ひしかり交流館	多目的複合施設	10 産業系施設	342.00	木造	2000	24	20	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	部位修繕	7,235								7,235		
113	142	大口生活改善センター	給食室・調理室	10 産業系施設	355.80	鉄筋コンクリート造	1983	50	37	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	大規模改修	39,138									39,138	

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－11

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
114	144	菱刈生活改善センター	集会所	10 産業系施設	310.31	鉄骨造	1979	38	41	B	C	C	C	C	43	D	Ⅲ	簡易補修	0										
115	145	菱刈農畜産物処理加工施設	給食室・調理室 1	10 産業系施設	99.00	鉄骨造	1979	38	41	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
115	145	菱刈農畜産物処理加工施設	給食室・調理室 2	10 産業系施設	77.90	鉄骨造	1979	38	41	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
116	146	山ノ神堆肥センター	堆肥舎 1	10 産業系施設	2,622.96	鉄骨造	2009	38	11	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	大規模改修	102,295										102,295
116	146	山ノ神堆肥センター	堆肥舎 2	10 産業系施設	2,024.37	鉄骨造	2009	38	11	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	大規模改修	78,950										78,950
116	146	山ノ神堆肥センター	堆肥舎 3	10 産業系施設	2,142.00	鉄骨造	2009	38	11	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	大規模改修	83,538										83,538
117	135	平出水集落排水施設	処理場	11 下水道施設	123.87	鉄筋コンクリート造	2003	50	17	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
118	137	農業集落排水施設	菱刈北部地区	11 下水道施設	847.00	鉄筋コンクリート造	1997	50	23	A	A	B	B	B	84	D	Ⅰ	簡易補修	0										
119	138	一般廃棄物最終処分場	宮人処分場処理棟	12 供給処理施設	225.00	鉄骨造	1987	38	33	B	B	C	C	C	53	C	Ⅰ	部位修繕	22,530	1,530	2,000	2,000	2,000	3,500	2,000	2,000	2,000	2,000	3,500
120	139	大口リサイクルプラザ	粗大ごみ処理施設	12 供給処理施設	1,616.07	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	28,000	6,000	11,000	11,000							
120	139	大口リサイクルプラザ	機械室・機械棟	12 供給処理施設	130.00	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	15,000	1,000		1,000	5,000	1,000		1,000		1,000	5,000
120	139	大口リサイクルプラザ	浸出水処理施設	12 供給処理施設	653.08	鉄筋コンクリート造	1999	50	21	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	部位修繕	98,040	8,040	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
121	140	牛尾湧水処理施設	一般事務所	12 供給処理施設	114.40	鉄骨造	1988	38	32	B	B	B	B	B	75	D	Ⅰ	大規模改修	4,462									4,462	
122	165	旧伊佐市衛生センター	一般事務所	12 供給処理施設	256.00	鉄筋コンクリート造	1991	50	29	A	B	C	B	B	64	F	Ⅲ	部位修繕	1,577			1,577							
123	165	(きらり館) 伊佐市衛生センター	処理棟	12 供給処理施設	1,717.63	鉄筋コンクリート造	2017	50	3	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	部位修繕	173,415	13,773	18,607	24,206	24,815	20,224	43,262	28,530			
123	165	(きらり館) 伊佐市衛生センター	車庫棟	12 供給処理施設	112.00	鉄骨造	2017	38	3	A	A	A	A	A	100	D	Ⅰ	簡易補修	0										
124	18	伊佐市菱刈生活支援ハウス	養護施設	13 その他	818.00	鉄筋コンクリート造	1993	50	27	C	C	C	C	C	40	D	Ⅲ	簡易補修	0										
125	73	大口小学校長住宅	教職員住宅	13 その他	69.94	木造	1982	24	38	B	D	B	B	B	56	D	Ⅱ	部位修繕	1,000				1,000						
126	74	大口小教頭住宅	教職員住宅	13 その他	92.98	木造	1979	24	41	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	部位修繕	1,000				1,000						
127	75	大口東小教頭住宅	教職員住宅	13 その他	69.94	木造	1979	24	41	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	部位修繕	1,000				1,000						
128	76	大口東小学校長住宅	教職員住宅	13 その他	76.18	木造	1995	24	25	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
129	77	牛尾小教頭住宅	教職員住宅	13 その他	63.59	木造	1994	24	26	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
130	78	牛尾小学校長住宅	教職員住宅	13 その他	85.98	木造	1998	24	22	A	A	B	B	A	87	E	Ⅱ	簡易補修	0										
131	80	山野小学校長住宅	教職員住宅	13 その他	78.90	木造	1995	24	25	B	A	B	B	B	82	E	Ⅱ	簡易補修	0										
132	82	平出水小学校長住宅	教職員住宅	13 その他	69.94	木造	1978	24	42	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	部位修繕	1,000					1,000					
133	83	平出水小教頭住宅	教職員住宅	13 その他	64.49	木造	1991	24	29	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－12

個別計画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	耐用年数	経過年数	部位別劣化度					健全度	保全優先度	重要度	対策内容	計画期間内の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋根	外壁	内部	電気	機械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
134	84	羽月小学校長住宅	教職員住宅	13 その他	87.69	木造	1999	24	21	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
135	85	羽月小教頭住宅	教職員住宅	13 その他	84.33	木造	2000	24	20	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
136	88	羽月西小教職員住宅	教職員住宅 1	13 その他	63.07	木造	1994	24	26	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
136	88	羽月西小教職員住宅	教職員住宅 2	13 その他	70.13	木造	1979	24	41	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	部位修繕	1,000					1,000					
137	89	曾木小教職員住宅	曾木小学校長住宅	13 その他	70.13	木造	1981	24	39	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	部位修繕	1,000								1,000		
137	89	曾木小教職員住宅	曾木小教頭住宅	13 その他	70.13	木造	1980	24	40	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	部位修繕	1,000								1,000		
138	91	大口中央中教職員住宅	教職員住宅	13 その他	84.81	木造	2003	24	17	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 4 号	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 5 号	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 6 号	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 7 号	13 その他	52.25	木造	1973	24	47	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 1 号	13 その他	52.25	木造	1972	24	48	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 2 号	13 その他	52.25	木造	1972	24	48	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
139	92	第 2 菱刈教職員住宅	第 2 菱刈教職員住宅 3 号	13 その他	52.25	木造	1972	24	48	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,142									2,142	
140	94	菱刈小学校校長・教頭住宅	菱刈小学校校長住宅	13 その他	101.23	木造	1994	24	26	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
140	94	菱刈小学校校長・教頭住宅	菱刈小学校教頭住宅	13 その他	93.48	木造	1994	24	26	A	A	B	B	B	84	E	Ⅱ	簡易補修	0										
141	95	湯之尾小学校校長住宅	教職員住宅	13 その他	92.50	木造	1996	24	24	C	B	B	B	B	72	E	Ⅱ	部位修繕	1,000							1,000			
142	96	湯之尾小教職員住宅	湯之尾教職員住宅（1 号）	13 その他	72.04	木造	1989	24	31	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
142	96	湯之尾小教職員住宅	湯之尾教職員住宅（2 号）	13 その他	72.04	木造	1989	24	31	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
143	97	南永小学校校長住宅	教職員住宅	13 その他	92.50	木造	1996	24	24	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
144	98	南永教職員住宅	教職員住宅	13 その他	92.50	木造	1997	24	23	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
145	99	前目麓教職員住宅	教職員住宅	13 その他	256.78	木造	1996	24	24	A	A	B	B	B	84	F	Ⅲ	簡易補修	0										
146	100	本城小学校校長住宅	教職員住宅	13 その他	92.50	木造	1997	24	23	B	B	B	B	B	75	E	Ⅱ	簡易補修	0										
147	101	本城小教職員住宅	教職員住宅	13 その他	73.72	木造	1983	24	37	B	C	B	B	B	65	F	Ⅲ	部位修繕	1,000							1,000			
148	102	前目教職員住宅	教職員住宅	13 その他	60.16	木造	1970	24	50	C	C	C	C	D	36	C	Ⅲ	解体	2,467										2,467
149	103	菱刈中学校校長住宅	教職員住宅	13 その他	124.21	木造	1988	24	32	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	部位修繕	1,000						1,000				

「計画期間内の対策内容・実施時期・費用試算一覧」－13

個別計画 画 NO	総合管理計画 NO	施設名称	建物名称	施設用途	延床面積 (㎡)	構造	建築 年度	耐用 年数	経過 年数	部位別劣化度					健全 全度	保 全 優 先 度	重 要 度	対策内容	計画期間内 の費用合計 (千円)	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
										屋 根	外 壁	内 部	電 気	機 械						金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
150	104	教育長住宅	教職員住宅	13 その他	82.65	木造	2002	24	18	A	A	A	A	A	100	E	Ⅱ	簡易補修	0										
151	105	学校教育課長住宅	教職員住宅	13 その他	89.64	木造	1972	24	48	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	解体	3,675								3,675		
152	136	大型車庫施設	車庫・駐車場 1	13 その他	243.40	鉄骨造	1983	38	37	C	C	B	B	B	62	F	Ⅲ	簡易補修	0										
153	79-1	山野小学校教頭住宅	教職員住宅	13 その他	69.94	木造	1983	24	37	C	C	B	B	B	62	E	Ⅱ	部位修繕	1,000								1,000		
154	79-2	山野境目住宅（山野中 校長,教頭住宅）	教職員住宅 1	13 その他	69.94	木造	1977	24	43	C	D	D	D	D	13	C	Ⅲ	解体	2,868								2,868		
154	79-2	山野境目住宅（山野中 校長,教頭住宅）	教職員住宅 2	13 その他	69.94	木造	1983	24	37	C	C	D	D	D	21	C	Ⅲ	解体	2,868								2,868		
155	90-1	針持小教職員住宅 1	針持小校長住宅	13 その他	69.94	木造	1978	24	42	C	C	C	C	D	36	B	Ⅱ	部位修繕	1,000							1,000			
156	90-2	針持小教職員住宅 2	針持小教頭住宅	13 その他	73.70	木造	1995	24	25	B	A	B	B	B	82	E	Ⅱ	簡易補修	0										
157	2	菅公アパレル工場貸付 地	工場	14 普通財産	1,322.75	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1978	50	42	C	C	C	C	C	40	C	Ⅱ	簡易補修	0										
158	3	淡水養魚場	一般事務所	14 普通財産	226.76	木造	1960	24	60	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	解体	9,297									9,297	
158	3	淡水養魚場	作業所	14 普通財産	190.53	軽量鉄骨造	1970	26	50	D	D	D	D	D	10	C	Ⅲ	解体	5,525									5,525	
159	4	羽月西土地改良区貸付 地	作業所	14 普通財産	139.12	木造	1978	24	42	C	C	C	C	C	40	D	Ⅲ	簡易補修	0										
160	5	本城校区ｺﾐｭﾆﾃﾞｲ貸付地 (旧本城駐在所)	本城駐在所	14 普通財産	102.68	木造	1997	24	23	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
161	19	伊佐市シルバー人材セ ンターワークプラザ	庁舎	14 普通財産	318.33	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1969	50	51	B	C	C	C	C	43	D	Ⅲ	簡易補修	0										
162	55	羽月北小学校	校舎・園舎	14 普通財産	436.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1980	50	40	D	D	B	B	B	51	E	Ⅲ	解体	22,672									22,672	
162	55	羽月北小学校	体育館	14 普通財産	608.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1996	50	24	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
163	66	山野中跡地	校舎 1	14 普通財産	1,796.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1972	50	48	D	C	C	C	D	34	C	Ⅲ	解体	93,392										93,392
163	66	山野中跡地	校舎 2	14 普通財産	617.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1960	50	60	D	C	C	C	D	34	C	Ⅲ	解体	32,084										32,084
163	66	山野中跡地	格技場	14 普通財産	305.00	鉄骨造	1978	38	42	C	C	C	C	C	40	D	Ⅲ	簡易補修	0										
164	72	曾木公売地	（旧）大口南中教職員 住宅	14 普通財産	63.06	木造	1992	24	28	B	B	B	B	B	75	F	Ⅲ	簡易補修	0										
165	81-1	（株）かいたく貸付地 （山野西住宅）	教職員住宅 1	14 普通財産	56.82	木造	2000	24	20	A	A	B	B	B	84	F	Ⅲ	簡易補修	0										
166	86-2	羽月北校区ｺﾐｭﾆﾃ ﾞｲ貸付(旧羽月北小教 職員住宅)	羽月北住宅 3 号	14 普通財産	62.53	木造	1986	24	34	C	B	B	B	B	72	F	Ⅲ	簡易補修	0										
167	151	ひまわり福祉会貸付地 （旧伊佐市大口心身障 害者等福祉センター）	多目的福祉施設	14 普通財産	351.11	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 造	1972	41	48	C	C	C	C	C	40	C	Ⅱ	簡易補修	0										
年度ごと費用合計 (千円)																		181,585	2,763,514	2,775,080	470,494	514,545	496,628	516,132	513,134	512,493	514,588		

第6章 計画のフォローアップ

第1節 計画のフォローアップ

本市では、総合管理計画の基本方針として①公共施設等の適正配置と総量縮減、②公共施設等の長寿命化と安全性の確保、③公共施設等の効率的な管理運営を進めていくことを設定しています。

その中で、②公共施設等の長寿命化と安全性の確保に関しては、本計画において点検を実施し、安全対策が必要となる施設についての整理を行い、優先順位を設定し見込まれる時期及び費用について推計を行いました。なお、本計画は市の財政状況や公共施設を取り巻く状況等を踏まえ、適宜見直しを行いながら進めていきます。

また、本計画と並行して、①公共施設等の適正配置と総量縮減、③公共施設等の効率的な管理運営についても進めていきます。

施設の利用状況や運営コスト、地域性や機能性など施設の状況等から、保有施設の適正配置や中長期的な在り方について整理を行い、複合化や用途変更、統廃合等を推進することにより、総量の縮減に向けて取り組んでいきます。

今後も維持管理していく施設については、利用率向上と管理運営コスト抑制のため、公共施設の有効活用を図るとともに、民間活力を導入するなど、効率的な管理運営に努めます。

推進にあたっては、全庁的な実施体制を整備して一元的にマネジメントを行うとともに、市民や施設利用者との合意形成も図りながら目標達成に向けて進めていきます。

伊佐市公共建築物個別施設計画

令和3年3月発行

編集・発行 伊佐市 財政課

〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里 1888 番地

電話 0995-23-1311

E-mail kanzai@city.isa.lg.jp
